



**VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL VALLE DEL CAUCA - PDA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES – PAEI 2019**

BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2020

SANTIAGO DE CALI, 28 DE FEBRERO DE 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES – PAEI 2019

BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2020, CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2020

**NOTAS ACLARATORIAS, REPORTES DE LOS 3 PRIMEROS BIMESTRES DE 2020,
ENERO A JUNIO 2020, DENTRO DEL PAEI DE 2019.**

El Decreto Nacional 1425 del 6 de agosto de 2019 subrogó el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los PDA.

El Gobierno Nacional se tomó cerca de 9 meses para expedir la respectiva reglamentación. Como insumo fundamental para la elaboración de los instrumentos de planificación a ser elaborados observando lo dispuesto en el referido Decreto 1425 de 2019 era necesario la concertación de los nuevos “Planes de Acción” con cada una de las 42 administraciones municipales y Distritales del Valle del Cauca”, labor que resultó dispendiosa y se estuvo culminando en junio de 2020.

En virtud del precitado Decreto 1425 de 2019 era necesario elaborar y someter a consideración del Comité Directivo del PDA los instrumentos de planeación, incluyendo el PGEI y el hasta ahora denominado PAEI. Mientras tanto, y aún en los primeros meses de 2020, se seguía operando con los instrumentos de planificación anteriores.

El 4 de febrero de 2019 fue aprobado el PAEI por valor total de \$31.887,6 millones computando todas las fuentes de recursos. Con las modificaciones aprobadas por el Comité Directivo durante ese año se culminó diciembre con un PAEI por valor total de \$41.258,4 millones, y con una ejecución de \$38.345,7 millones equivalente al 92,9%.

Al no contarse con los instrumentos de planificación aprobados para el periodo 2020-2023, las modificaciones y priorización de recursos realizados en el primer semestre de dicho año 2020 terminaron computándose en el PAEI de 2019 y en el PGEI 2016-2019.

Es por ello que cuando se están presentando los informes bimestrales de enero a junio de 2020 hacemos referencia al PAEI de 2019.

El Comité Directivo del PDA, en sesión del 14 de julio de 2020 aprobó los nuevos instrumentos de planeación observando lo previsto en el Decreto Nacional 1425 de agosto de 2019. El nuevo Plan Estratégico de Inversiones cubrió el periodo julio 2020 a diciembre de 2023, y en la práctica el capítulo anual 2020 de dicho PEI abarcó el lapso julio a diciembre de 2020.

Significa que los Informes Bimestrales julio-agosto, septiembre-octubre, y noviembre-diciembre de 2020 se presentan referenciados con el Comité Directivo del 14 de julio de

2020, e instrumentos de planeación allí aprobados para el periodo julio 2020 – Diciembre 2023.

Acorde con lo antes expuesto, en los Informes Bimestrales de enero a junio de 2020 se presentará como antecedentes, el historial del PAEI de 2019.

1. ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE PLANEACIÓN

COMITÉ DIRECTIVO: El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca está conformado por las siguientes personas:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.				
GESTOR DEL PDA DEL VALLE DEL CAUCA				
MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO DEL PDA				
AÑO:	2020			
No.	NOMBRE (S)	APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO
A) REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL:				
1	Juan Pablo	Serrano Castilla	Viceminist. de Agua y Saneam. Básico (VASB) - MVCT.	Subdirector de Estructuración de Programas
2	Beatriz	Giraldo Castaño	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Subdirectora de Agua y Saneamiento
B) REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:				
3	Clara Luz	Roldán González	Departamento del Valle del Cauca	Gobernadora
4	Heiller Hernán	Jurado Rubio	Departamento del Valle del Cauca	Secretario de Vivienda y Hábitat
C) REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS:				
5	Heriberto	Cabal Aguilar	Alcalde Municipio de Riofrío	Alcalde
6	Jorge Eliécer	Ramírez Mosquera	Alcalde Municipio de Candelaria	Alcalde
D) REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				
	Maraco Antonio	Suárez Gutiérrez	Cción. Autónomo Regional del Valle del Cauca (CVC)	Director General
E) REPRESENTANTES CON VOZ Y SIN VOTO:				
	Moisés	Cepeda Restrepo	Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.	Gerente
	Nelcy	Rivera Alzate	Consorcio Fiduciario FIA	Gerente

La política para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca se lleva a cabo por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., entidad creada mediante escritura pública No. 4792 de octubre de 2009, con un capital suscrito y pagado de \$500 millones, de los cuales el 94.4% (\$472.000.000,00 M/Cte) corresponde a la Gobernación y el 5.6% restante (\$28.000.000,00 M/Cte) a 14 municipios, cada uno con un 0,4% de las acciones, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

No.	ACCIONISTAS	Porcentaje
1	MUNICIPIO DE ALCALA	0,4%
2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	0,4%
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	0,4%
4	MUNICIPIO DE ARGELIA	0,4%
5	MUNICIPIO DE BUGA	0,4%
6	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	0,4%
7	MUNICIPIO DE EL AGUILA	0,4%
8	MUNICIPIO DE EL CAIRO	0,4%
9	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	0,4%
10	MUNICIPIO DE RIOFRIO	0,4%
11	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0,4%
12	MUNICIPIO DE SEVILLA	0,4%
13	MUNICIPIO DE TORO	0,4%
14	MUNICIPIO DE VIJES	0,4%
15	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	94,4%
TOTAL		100,0%

Vallecaucana de Aguas es responsable de la coordinación, gestión e implementación del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – PDA, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento en la tarea de asegurar la prestación de tales servicios mediante las actividades de modernización empresarial y/o el fortalecimiento institucional y/o desarrollo y/o consolidación de una cultura empresarial en los prestadores, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones, y la implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social, que aseguren la materialización de un proyecto integral para el sector.

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Para el cumplimiento de su misión Vallecaucana de Aguas elaboró y ajustó los instrumentos de planeación estratégica establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, los cuales fueron aprobados por el Comité Directivo del PDA. Estos instrumentos son:

Reglamento del Comité Directivo del PDA: Define la estructura y reglas internas para al funcionamiento de la máxima instancia de decisión del PDA.


Manual Operativo: Instrumento operativo en el cual se especifican los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el PDA en el departamento del Valle del Cauca.

Plan General Estratégico y de Inversiones - PGEI: Instrumento de planificación que recoge: El diagnóstico por componente y municipio que sirve de línea de base para el PDA, las metas identificadas por componente para cada municipio, y los recursos potenciales asociados a cada componente distinguiendo cada una de las fuentes de financiación.

Plan Anual Estratégico y de Inversiones - PAEI: Instrumento que señala, para cada año del PDA, el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PDA, identificando las respectivas fuentes de recursos que se utilizarán para la financiación respectiva. En el PAEI se incluyen las inversiones a realizar en cada uno de los componentes para el cumplimiento de las metas del PDA. El PAEI desarrolla el alcance, distribución de recursos y cronograma por trimestres.

PARTICIPANTES

El 100% de los municipios del departamento (42) están vinculados al PDA del Valle del Cauca

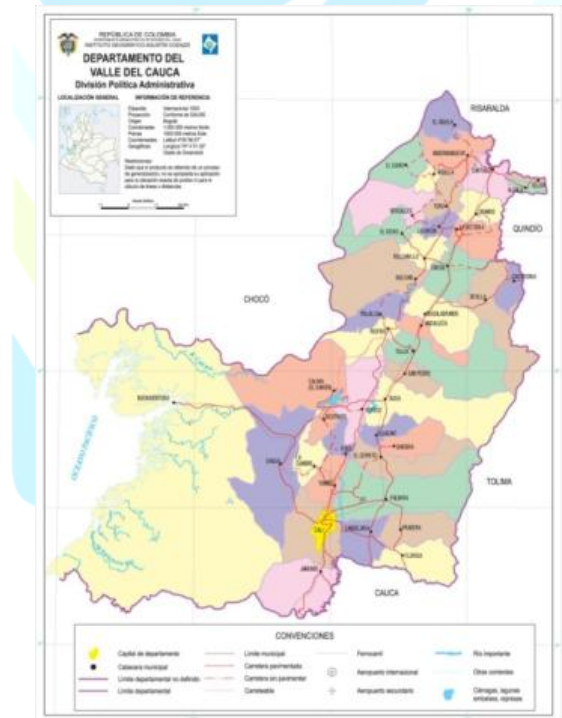

2. PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES PAEI – 2019

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., en su condición de Gestor del PDA del Valle del Cauca, presenta el informe de ejecución del Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2019 con corte a 29 de Febrero de 2020. De manera coherente con los objetivos y metas estipuladas en el PAEI, el informe presenta los logros alcanzados en cada uno de los componentes del PDA: i) Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, ii) Infraestructura, iii) Componente Ambiental, iv) Gestión del riesgo sectorial y v) Residuos sólidos.

El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca en sesión del 04 de Febrero de 2019 (Acta No. 35) aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones (PAEI) por valor de \$31.887,6 millones, de los cuales \$24.521,3 millones provienen del SGP del Departamento, \$ 4.429,1 millones de recursos propios del Departamento, \$ 1.381,6 millones de los municipios y otros vinculados y \$1.55,6 millones de Audiencias Públicas de la Nación. Se observa que el 72,5% del total del PAEI de 2019 estaba orientado al capítulo de inversiones en agua y saneamiento.

La primera modificación de éste PAEI se produjo en la reunión de Comité Directivo del PDA del 7 de marzo de 2019 (Acta No. 36), con una **adición en recursos por valor total de \$4.828,6 millones** por diferentes fuentes, así:

Fuente Nación, Audiencias Públicas:	\$ 148,7 millones
Fuente SGP del Departamento del Valle:	4.157,4 millones
Fuente Recursos Propios del Departamento del Valle:	383,5 millones
Fuente Recursos de Municipios:	139,0 millones
GRAN TOTAL, Aj. para adicionar en CD de 7 Mar. 2019:	<u>\$ 4.828,6 millones</u>

Con esta adición el PAEI de 2019 pasó de \$31.887,6 millones a \$36.716,2 millones.

El Comité Directivo, en su sesión virtual del 9 de abril de 2019 (Acta No. 37) priorizó recursos de la siguiente forma:

- Para reformulaciones de 5 obras: \$ 993,9 millones.
- Para reformulación de las respectivas 5 interventorías: \$ 79,5 millones.
- Para reformulación de una interventoría adicional: 115,8 millones.

La segunda modificación del PAEI de 2019 fue aprobada en Comité Directivo del 27 de mayo de 2019 (Acta No. 38) y en ella se incorporó un nuevo aporte de \$1.300 millones de recursos de libre destinación del Departamento.

Con esta adición el PAEI de 2019 pasó de \$36.715,3 millones a \$38.015,3 millones.

En la misma sesión se realizó la siguiente priorización de recursos:

a) Para incrementar los gastos del Gestor den 2019	\$ 1.300,0 millones
b) Reformulaciones de proy. de obras y sus respectivas interventorías	3.832,2 millones
c) Priorización recursos para estudios y diseños	350,1 millones

La tercera modificación del PAEI de 2019 fue aprobada en Comité Directivo del 03 de septiembre de 2019 (Acta No. 39) y en ella se incorporaron recursos de la siguiente forma:

NACION, Audiencias Públicas, rendim. fros	\$	38.923.985,73
SGP del Departamento del Valle, rendim. fros		1.149.042.611,04
Recursos Propios del Dpto y otros recursos, rendim. fros		82.519.757,59
Recursos Propios del Dpto, nuevos aportes de 2019		1.766.999.252,00
Otros Recursos, indemnización Seguros del Estado		205.717.936,00
Recursos del crédito, operación aprobada por Invalle		<u>22.505.000.000,00</u>
GRAN TOTAL, Aj. para adicionar en CD de 3 Sept. 2019:	\$	<u>25.748.203.542,36</u>

Este valor total de **\$25.748.203.542,36** por diferentes fuentes fue adicionado a los subcomponentes y programas detallados en el Anexo No. 3, PAEI de 2019 que hace parte de Acta No. 39 del Comité Directivo.

Con esta adición el PAEI de 2019 pasa de \$38.015,3 millones a \$63.763,4 millones.

En la misma sesión se realizó la siguiente priorización de recursos:

a) Para 5 obras y sus respectivas interventorías: **\$41.323,9 millones**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.			COMITE DIRECTIVO DEL PAP-PDA				
PRIORIZACION RECURSOS			SESION DEL 3 DE SEPT. 2019				
PARA OBRAS			PARA OBRAS				
No.	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO OVEREDA	NOMBRE DEL PROYECTO	VR. TOTAL	FUENTE DE RECURSOS		
					Nación	SGP Dpto	Crédito
1	Guacarí	Guabas	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTARD DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ.	13.280.891.251	0	13.280.891.251	0
2	Calima El Darién	Casco Urbano	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS MANZANAS T, L, L', U, U' DEL BARRIO LA CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN CALIMA DARIÉN- VALLE DEL CAUCA.	561.035.719	0	561.035.719	0
3	Bolívar	Corregimientos de Ricaurte y La Herradura	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA	1.137.214.944	0	1.137.214.944	0
4	Versalles	Casco Urbano	OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA.	3.399.018.875	1.700.000.000	1.699.018.875	0
5	Buenaventura		CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE VENECIA Y OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA.	22.945.737.336	0	440.737.336	22.505.000.000
TOTAL PRIORIZACIONES PARA OBRAS, POR FUENTE DE RECURSOS				41.323.898.125	1.700.000.000	17.118.898.125	22.505.000.000

b) Para Ajuste Financiero de una interventoría: **\$ 145,4 millones.**

c) Para Estudios y Diseños de sistemas de acueducto de 3 comunidades de Buenaventura.	1.800,0 millones.
d) Para Conculoría Programa Siasar, sector rural de B/tura	1.200,0 millones.

El proyecto de obras de Buenaventura finalmente no se ejecutó en el PAEI de 2019, y tampoco en el PEI capítulo 2020. No se tiene previsto en el PEI capítulo 2021.

En esta misma sesión fue aprobado el Documento “Plan de Gestión de Riesgo Sectorial.”

La cuarta modificación del PAEI fue aprobada en la reunión del Comité Directivo del 6 de septiembre de 2019 (Acta No. 40), y surgió con la necesidad de ajustar el valor del crédito aprobado por Infivalle de \$28.186 millones, es decir, \$5.681 millones adicionales a los \$22.945 millones registrados en la reunión de Comité Directivo del 3 e septiembre de 2019 (Acta No. 39).

De esta forma el PAEI de 2019 pasa de \$63.763,4 millones a \$69.444,4 millones.

En la reunión se priorizaron recursos para la ejecución del proyecto de acueducto de Costa Rica y La Selva en el Municipio de Ginebra, por valor de \$4.793,2 millones (Obra y su respectiva Interventoría).

La quinta modificación en el valor total del PAEI fue aprobada por el Comité Directivo en su sesión del 26 de diciembre de 2019 (Acta No. 43).

En el PAEI de 2019 se había incluido el valor aprobado al Gestor por Infivalle (\$28.186 millones). Esta operación finalmente no se tramitó, razón por la cual se redujo.

En consecuencia el valor total del PAEI de 2019 pasó de \$69.444,4 millones a \$41.258,4 millones.

En esta sesión se aprobaron recursos para el funcionamiento del Gestor por un valor de \$1.075 millones para el funcionamiento de Vallec aucana de Aguas en el trimer trimestre de 2020, mientras se acaba de expedir la reglamentación que permita la realización del Comité Directivo donde se apruebe el PEI 2020-2023 y el capítulo 2020 del PEI, acorde con lo previsto en el Decreto Nacinal 1425 de agosto de 2019.

También se priorizaron recursos por valor de \$15,9 millones para ajuste de interventoría.

Acorde con lo anterior, el PAEI de 2019, incluyendo las modificaciones y priorizaciones realizadas exclusivamente durante dicho año 2019 cerró con un valor total de \$41.258,4 millones.

El PAEI de 2019 ejecutado, es decir, la sumatoria de los CDRs expedidos en 2019, igualmente incluyendo los movimientos del primer semestre de 2020 antes referido, ascendió a la suma de \$38.345,7 millones, equivalente al 92,9% de lo programado.

El detalle del PAEI programado para 2019, y lo ejecutado se muestra en los siguientes cuadros:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.						
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, EJECUCION PAEI						
PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2019.						
Anexo No. 3						
NUEVOS VALORES DE PAEI 2019, POR FUENTES						\$=Mills.
C O M P O N E N T E	NACION	DPTO SGP	DPTO R.P.	MCIPIOS Y OTROS	Recurso Crédito	TOTAL
	COMPONENTE 1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
1.1 Subcomponente Gestor	-	-	4.850,0	-	-	4.850,0
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecana de Aguas S.A. E.S.P.	-	-	4.850,0	-	-	4.850,0
1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	-	1.900,0	600,0	-	-	2.500,0
Promoc y fortalecim gestión empresar para el aseguram de la prestac de los servicios	-	100,0	50,0	-	-	150,0
Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e implementación de Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 de 2016	-	1.200,0	200,0	-	-	1.400,0
Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007	-	600,0	350,0	-	-	950,0
1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional	-	2.790,0	700,0	-	-	3.490,0
Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua.	-	1.730,0	450,0	-	-	2.180,0
Supervisión a Proyectos y Obras	-	300,0	150,0	-	-	450,0
Asistencia técnica a proyectos	-	760,0	100,0	-	-	860,0
1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos	-	-	29,1	-	-	29,1
SUBTOTAL COMPONENTE 1:	-	4.690,0	6.179,1	-	-	10.869,1
COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA						
2.1 Subcomponente Obras	1.743,2	21.937,7	1.433,0	1.725,4	-	26.839,3
a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias	1.743,2	21.420,2	1.433,0	1.725,4	-	26.321,8
b) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017	-	517,5	-	-	-	517,5
2.2 Subcomponente estudios y diseños	-	2.000,0	-	-	-	2.000,0
Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias	-	2.000,0	-	-	-	2.000,0
2.3 Subcomponente Gestión Predial	-	250,0	50,0	-	-	300,0
a) Levantam. Topográficos avalúos, y gestión predial.	-	100,0	50,0	-	-	150,0
b) Adquisición de Predios y pago de Servidumbre	-	150,0	-	-	-	150,0
SUBTOTAL COMPONENTE 2:	1.743,2	24.187,7	1.483,0	1.725,4	-	29.139,3
COMPONENTE 3. AMBIENTAL						
3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales	-	300,0	250,0	-	-	550,0
Apoyo al cumplim. y seguim. de mínimos ambientales - Permisos ambientales, PSMV, PAUEA, Conces. Vertim. Mapas de riesgo, etc.	-	300,0	250,0	-	-	550,0
3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial	-	50,0	-	-	-	50,0
Seguimiento y ajuste Plan Amb. Sectorial - Progr. Comités, Mesas Ambient, Codeparh	-	50,0	-	-	-	50,0
SUBTOTAL COMPONENTE 3:	-	350,0	250,0	-	-	600,0
COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL						
4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	-	100,0	-	-	-	100,0
Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	-	100,0	-	-	-	100,0
4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	-	-	-	-	-	-
Reducción del riesgo, y Manejo de desastres	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMPONENTE 4:	-	100,0	-	-	-	100,0
COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS						
5.1 Subcomponente Disposición Final	-	-	-	-	-	-
5.2 Subcomponente Aprovechamiento	-	500,0	50,0	-	-	550,0
Optimiz. PMIRS (Infraestr, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestr. de aprovech.	-	-	-	-	-	-
Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos.	-	300,0	50,0	-	-	350,0
Formulación, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca	-	200,0	-	-	-	200,0
SUBTOTAL COMPONENTE 5:	-	500,0	50,0	-	-	550,0
TOTAL GENERAL	1.743,2	29.827,7	7.962,1	1.725,4	-	41.258,4

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		MODIFICACION No. 6, 26 Dc. 2019						
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, EJECUCION PAEI		Anexo No. 3						
PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2019.							\$=Mills.	
\$ = Millones.								
COMPONENTE		PAEI DE 2019,		EJECUCION				Ejecuc.
		NACION	DPTO SGP	DPTO R.P.	MCIPIOS Y OTROS	Recurso Crédito	TOTAL	%
COMPONENTE 1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
1.1 Subcomponente Gestor		-	-	4.300,0	-	-	4.300,0	88,7%
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.		-	-	4.300,0	-	-	4.300,0	88,7%
1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios		-	1.900,0	450,0	-	-	2.350,0	94,0%
Promoc y fortalecim gestión empresar para el aseguram de la prestac de los servicios		-	100,0	50,0	-	-	150,0	100,0%
Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e implementación de Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 de 2016		-	1.200,0	200,0	-	-	1.400,0	100,0%
Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007		-	600,0	200,0	-	-	800,0	84,2%
1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional		-	2.790,0	550,0	-	-	3.340,0	95,7%
Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua.		-	1.730,0	450,0	-	-	2.180,0	100,0%
Supervisión a Proyectos y Obras		-	300,0	-	-	-	300,0	66,7%
Asistencia técnica a proyectos		-	760,0	100,0	-	-	860,0	100,0%
1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos		-	-	15,0	-	-	15,0	51,5%
SUBTOTAL COMPONENTE 1:		-	4.690,0	5.315,0	-	-	10.005,0	92,0%
COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA								
2.1 Subcomponente Obras		1.700,0	21.923,3	1.368,1	-	-	24.991,4	93,1%
a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias		1.700,0	21.405,8	1.368,1	-	-	24.473,9	93,0%
b) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017		-	517,5	-	-	-	517,5	100,0%
2.2 Subcomponente estudios y diseños		-	1.799,3	-	-	-	1.799,3	90,0%
Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias		-	1.799,3	-	-	-	1.799,3	90,0%
2.3 Subcomponente Gestión Predial		-	250,0	50,0	-	-	300,0	100,0%
a) Levantam. Topográficos avalúos, y gestión predial.		-	100,0	50,0	-	-	150,0	100,0%
b) Adquisición de Predios y pago de Servidumbre		-	150,0	-	-	-	150,0	100,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 2:		1.700,0	23.972,6	1.418,1	-	-	27.090,7	93,0%
COMPONENTE 3. AMBIENTAL								
3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales		-	300,0	250,0	-	-	550,0	100,0%
Apoyo al cumplim. y seguim. de mínimos ambientales - Permisos ambientales, PSMV, PAUEA, Conces. Vertim. Mapas de riesgo, etc.		-	300,0	250,0	-	-	550,0	100,0%
3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial		-	50,0	-	-	-	50,0	100,0%
Seguimiento y ajuste Plan Amb. Sectorial - Progr. Comités, Mesas Ambient, Codeparh		-	50,0	-	-	-	50,0	100,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 3:		-	350,0	250,0	-	-	600,0	100,0%
COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL								
4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial		-	100,0	-	-	-	100,0	100,0%
Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial		-	100,0	-	-	-	100,0	100,0%
4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial		-	-	-	-	-	-	-
Reducción del riesgo, y Manejo de desastres		-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMPONENTE 4:		-	100,0	-	-	-	100,0	100,0%
COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS								
5.1 Subcomponente Disposición Final		-	-	-	-	-	-	-
5.2 Subcomponente Aprovechamiento		-	500,0	50,0	-	-	550,0	100,0%
Optimiz. PMIRS (Infraestr. Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestr. de aprovech.		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos.		-	300,0	50,0	-	-	350,0	100,0%
Formulación, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca		-	200,0	-	-	-	200,0	100,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 5:		-	500,0	50,0	-	-	550,0	100,0%
TOTAL GENERAL		1.700,0	29.612,6	7.033,1	-	-	38.345,7	92,9%

A estas cifras de cierre inicial del PAEI de 2019 es necesario adicionar las modificaciones, adiciones y priorizaciones realizadas en el primer semestre de 2020, específicamente en los Comités Directivos realizados el 23 de abril y el 10 de junio de 2020 en los cuales se adicionaron recursos por valores de \$4.513,5 millones y \$4.427,2 millones, respectivamente, **con lo cual el nuevo valor del PAEI de 2019, incluyendo lo adicionado en el primer semestre de 2020, arroja un valor de \$50.199,4 millones de lo cual se ejecutó la suma de \$42.594,2 millones equivalente al 84,9%.**

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GESTOR EN 2019.

Para cubrir los costos de funcionamiento del Gestor durante el año 2019, el Comité Directivo aprobó recursos por un valor total de \$4.300 millones fuente recursos propios del Departamento, de libre destinación. Se tramitaron CDRs ante el FIA por idéntico valor.

En enero de 2020 se tramitó ante el FIA una partida de \$550 millones, a manera de anticipo para gastos del Gestor los cuales se computan en el PAEI de 2019 para acumular un total de \$4.850 millones.

RECAUDOS, RENDIMIENTOS, CDRS EXPEDIDOS, Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

A continuación se muestran las cifras reportadas por el FIA, desde el inicio de los giros de la Gobernación a este Patrimonio Autónomo en 2010, hasta el 31 de diciembre de 2019:

PATRIMONIO AUTONOMO FIA				
DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 31 DE 2019				
FUENTE	RECAUDADO AL 31/12/2019	RENDIMIENTOS AL 31/12/2019	CDR EXPEDIDOS AL 31/12/2019	DISPONIBILIDAD AL 31/12/2019
SGP	\$ 169.697.388.166,39	\$ 16.046.889.181,87	\$ 183.405.297.869,75	\$ 2.338.979.478,51
Recursos Nación	\$ 18.633.995.734,00	\$ 2.147.366.337,26	\$ 20.713.673.247,53	\$ 67.688.823,73
Regalías	-	-	-	-
Otros Recursos	\$ 40.425.671.368,00	\$ 1.483.608.074,13	\$ 40.716.226.727,85	\$ 1.193.052.714,28
TOTAL	\$ 228.757.055.268,39	\$ 19.677.863.593,26	\$ 244.835.197.845,13	\$ 3.599.721.016,52

RECAUDOS, RENDIMIENTOS, CDRS EXPEDIDOS, Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020:

En el siguiente cuadro se detalla los recaudos, rendimientos financieros, CDRs expedidos y el saldo de los recursos disponibles no comprometidos, con corte al 29 de febrero de 2020:

DISPONIBILIDAD FEBRERO 29 DE 2020				
FUENTE	RECAUDADO AL 29/02/2020	RENDIMIENTOS AL 29/02/2020	CDR EXPEDIDOS AL 29/02/2020	DISPONIBILIDAD AL 29/02/2020
SGP	\$ 171,319,714,073.39	\$ 16,344,597,226.05	\$ 183,405,297,869.75	\$ 4,259,013,429.69
Recursos Nación	\$ 18,633,995,734.00	\$ 2,159,903,972.45	\$ 20,713,673,247.53	\$ 80,226,458.92
Regalías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Recursos	\$ 40,425,671,368.00	\$ 1,504,303,441.90	\$ 41,582,172,727.85	\$ 347,802,082.05
TOTAL	\$ 230,379,381,175.39	\$ 20,008,804,640.40	\$ 245,701,143,845.13	\$ 4,687,041,970.66

INFORMACION REFERIDA ESPECIFICAMENTE AL USO DE RECURSOS DEL BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2020.

REUNIONES DE COMITES DIRECTIVOS REALIZADOS EN EL BIMESTRE:

No se realizaron reuniones en este periodo.

RECAUDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PERIODO:

En el siguiente cuadro se detalla los recaudos, rendimientos financieros, y CDRs expedidos por el FIA en el bimestre, acorde con la información reportada por el FIA:

FUENTE	Recaudos Ene. y Feb. 2020	Rendim. Ene. Y Feb. 2020	CDR expedidos Ene. Y Feb. 2020
SGP	\$ 1.622.325.907	\$ 297.708.044	\$ -
Recursos Nación	\$ -	\$ 12.537.635	\$ -
Regalías	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Recursos	\$ -	\$ 20.695.368	\$ 865.946.000
TOTAL	\$ 1.622.325.907	\$ 330.941.047	\$ 865.946.000

DETALLE DE LOS CDRs EXPEDIDOS EN EL BIMESTRE:

En el bimestre se tramitaron ante el FIA 4 CDRs por valor total de \$865,9 millones tal como se muestra en el siguiente cuadro:

2020									
No.	Mes	COMPONENTE	PROYECTO	NACION	SGP DPTO	DPTO RP	Mcipios y Otros	TOTAL	
CDR									
9088	1	Aseguramiento	1.1 Gestor, Costos Gestor, Antic. para 1er. Trim. 20	-		550.000.000			550.000.000
9095	2	Invers. en Infraestr.	2.1 INTERV. OBRAS, Obra Pozo Vjies, Aj. Fro			15.946.000			15.946.000
9096	2	Aseguramiento	1.3, Superv. A Proy. y Obras			150.000.000			150.000.000
9097	2	Aseguramiento	1.2 Asegur. Prestac. Serv. Asist. Mcipios Cargue SUI			150.000.000			150.000.000
Total CDRs expedidos Bimestre Ene-Feb. 2020				-	-	865.946.000	-	-	865.946.000

AVANCES EN EL BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2020, EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PAEI.

Como ya se explicó, a la fecha de corte del bimestre enero-febrero de 2020 no se contaba con PEI aprobado para dicho año, razón por la cual los avances que a continuación se presentan corresponden a proyectos que ya se venían ejecutando correspondientes a periodos anteriores.

3.1. COMPONENTE I: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

➤ Asistencia y acompañamiento a municipios para la certificación art. 4ª ley 1176 del 2007

Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, realiza asistencia técnica y acompañamiento a los municipios para la certificación que expide la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de Saneamiento Básico y agua Potable para cada uno de los municipios del Valle del Cauca.

Los funcionarios de Vallecaucana no solo prestan asistencia técnica a los municipios, sino también a las pequeñas empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de que estas se fortalezcan en la prestación de los servicios, últimamente se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de los acueductos rurales a través del plan de aseguramiento 2017 y 2018.

El Grupo de aseguramiento de Vallecaucana de aguas conformado por siete profesionales de diversas áreas académicas, se encarga de velar por la asistencia técnica a cada uno de los Municipios del Valle del Cauca, con el fin de que estos sean certificados en SGP-APSB y puedan administrar de manera autónoma sus recursos. Teniendo en cuenta que existen 3 municipios descertificados – Vigencia 2017, a saber: El Cerrito, Andalucía y Alcalá, Vallecaucana de Aguas enfocó sus esfuerzos en el 2019 a recertificar estos municipios y a mantener la certificación de los demás. A la fecha de corte de este informe satisfactoriamente podemos afirmar que los municipios mencionados fueron recertificados.

➤ Promoción y fortalecimiento de la gestión empresarial para el aseguramiento de la prestación de los servicios

En el marco del Plan de Aseguramiento de Acueductos Rurales 2018, Vallecaucana de Aguas logró priorizar y asesorar 20 acueductos en 11 municipios. La asesoría se dirigió a socializar e instruir a los municipios y prestadores de servicios en el cumplimiento de la normatividad

establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y demás entes de control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios.

Para el 2019, se definió como meta fortalecer a por lo menos 20 acueductos rurales de 10 municipios (Ver cuadros siguientes). Para alcanzar este propósito Vallec aucana de Aguas contrató los profesionales, bienes y servicios necesarios.

PALMIRA	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA QUISQUINA	CERRITO	ASOCIACION COMUNITARIA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DEL PLACER
	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO		ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO TENERIFE
	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TAURETE - TABLONES		ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y/O ASEO DEL CORREGIMIENTO DEL POMO VEREDA EL ROSARIO
	ASOCIACION COMUNITARIO Y ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO DE TENJO	SAN PEDRO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SAN JOSE
	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO PARTE BAJA DE TENJO		ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO LOS CHANCOS
FLORIDA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PEDREGAL	GUACARÍ	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL SANTA ROSA DE TAPIAS
	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUALLANITO		ACUEDUCTO CHAFALOTE LA JULIA
YOTOCO	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL CORREGIMIENTO MEDIA CANOA	BUENAVENTURA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CORREGIMIENTO ZARAGOSA
PRADERA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO EL RECREO	TULUÁ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO TRES ESQUINAS
	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO POTRERITO	ROLDANILLO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO "ASODISRIEGO" DEL CORREGIMIENTO DE CAJAMARCA

El Plan de Aseguramiento 2019 denominado "El Agua esta en Vos" tiene como objetivo fundamental mejorar los indices de la calidad de vida de los habitantes en la zona rural a traves de una efectiva prestavion del servicio publico de agua potable, siendo posible alcanzar este objetivo de la efectividad a traves del fortalecimiento en las debilidades encontradas en cada uno de los acueductos rurales, y que se fortaleceran a traves de los grupos multidisciplinarios conformados por el personal contratista del grupo de aseguramiento de vallec aucana de aguas. En la actualidad el proyecto fue presentado ante el MVCT en donde se adelantaron los primeros requerimientos por parte del ministerio, en aras de buscar la aprobacion del mismo con el fin de iniciar su ejecucion en el mes de junio hasta noviembre de 2019.

Una vez notificadas cada una de las alcaldías de los municipios seleccionados para la ejecución del plan de fortalecimiento institucional 2019 "El Agua Esta en Vos" se llevó a cabo la estructuración de la base de datos de cada uno de los acueductos rurales en aras de obtener

información precisa de quienes ejercen el rol de administradores en cada uno de estas asociaciones de acueductos comunitarios.

Así las cosas, posteriormente se procede a notificar a cada uno de los 20 acueductos rurales de la puesta en marcha del plan de fortalecimiento institucional 2019 “El Agua Esta en Vos” y se lleva a cabo la conformación de los cinco (5) grupos multidisciplinarios así como la asignación de cuatro (4) acueductos rurales por grupo, teniendo en cuenta factores de distancia y desplazamiento a cada sector para hacer un reparto equitativo.

A su vez, se llevó a cabo la elaboración de las presentaciones institucionales con las que se abordan cada uno de los aspectos a intervenir, tales como: aspecto legal, administrativo, comercial, financiero y técnico operativo.

En la actualidad el plan de fortalecimiento institucional 2019 “El Agua Esta en Vos” se encuentra en proceso de ejecución, en donde inicialmente se abordan aspectos tan importantes como la elaboración del catastro de suscriptores y la implementación de la metodología que proponemos frente a la elaboración y asignación de número de suscriptores. Adicional a ello, cada uno de los profesionales jurídicos en cada grupo se encuentra adelantando la socialización de este aspecto y contribuyendo a los acueductos rurales con la renovación de sus estatutos, implementación de un contrato de condiciones uniformes de acueducto, obtener la personería jurídica ante cámara de comercio en sus respectivos municipios, la conformación de la oficina de PQR que exige el régimen de servicios públicos a estos prestadores.

A todas las actividades descritas se están realizando sus respectivos reportes de avance y ejecución a través de la matriz de seguimiento y control.

➤ **Diagnóstico de infraestructura rural y saneamiento, y apoyo a Planes de Gestión para pequeños operadores - SIASAR**

Durante el 2019 se busca levantar información de diagnóstico de por lo menos 200 acueductos rurales en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca, y adelantar la formulación de 20 Planes de Gestión en el marco de la plataforma SIASAR.

Se dió inicio al trámite de contratación de los profesionales, bienes y servicios necesarios para alcanzar las metas planteadas.

A la fecha de este informe se han realizado las siguientes actividades:

- ❖ 185 visitas a acueductos rurales donde se han aplicado los tres formularios.
- ❖ Digitación de 88 formularios diligenciados
- ❖ Formulación de 14 planes de gestión para 14 comunidades.

➤ **Plan de Gestión Social – Cultura del Agua**

Para la vigencia 2019, se firmó el Contrato No. 2000.13.02.279-2019 cuyo objeto es la “IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Contratista: FUNDACION HUELLA PATRIA.

Fecha acta de inicio: Septiembre 20 de 2019

Valor: \$300.000.000

Tiempo del Contrato: Seis meses

Fecha de terminación: Marzo 20 de 2020

A 29 de Febrero de 2020 se habían desarrollado las siguientes actividades:

El objetivo del proyecto es: promover conocimientos sobre el manejo y uso adecuados del agua mediante la implementación del programa cultura del agua en la zona rural y urbana de los municipios de la Cumbre, Pradera y Vijes.

Talleres comunitarios con los LÍDERES, el contratista realiza un taller cada semana con diferentes temáticas el ultimo talleres es una salida de campo a una planta de tratamiento de agua de su municipio.

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	FECHA
La Cumbre	Taller con comunidades- Dirección: Calle 1 # 2 - 32 Barrio la Estación- Recopilación jornada 1, 2 y 3	5 de febrero 12 de febrero 19 de febrero 26 de febrero
Palmira	Taller con comunidades- Centro Cultural Guillermo Barney Materon - Cra 29 # 30 - 40	06 de Febrero 13 de Febrero 20 de Febrero 27 de Febrero
Pradera	Taller con comunidades- Corregimiento Lomitas	19 de febrero
Vijes	Taller con comunidades- Caimital	22 de febrero

- **Registro Fotográfico, taller en Palmira**



- **Asistencia Técnica a Proyectos**

Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, se brinda apoyo técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el Mecanismo de Viabilización perteneciente de ocho (8) Estudios y Diseños para los municipios El Aguila, Ginebra, Vijes, El Dovio, Caicedonia, Ulloa, Andalucía y Pradera los cuales se presentan en la Tabla.

TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL

SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	CGTO Y/O VEREDA	PROYECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	VIJES	SANTA ANA	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA SANTA ANA MUNICIPIO DE VIJES
ESTUDIOS Y DISEÑOS	EL DOVIO	CASCO URBANO	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO EMISOR FINAL A PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DOVIO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	CAICEDONIA	SAMARIA	PTAP PARA LA VEREDA DE SAMARIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	ULLOA	ZONA RURAL	ACUEDUCTO INTERVEREDAL PTAP VEREDAS
ESTUDIOS Y DISEÑOS	ANDALUCIA	CAMPO ALEGRE	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO ALEGRE – FASE 2
ESTUDIOS Y DISEÑOS	PRADERA	LA GRANJA	ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GRANJA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	EL AGUILA	EL CEDRAL	SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL CEDRAL EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	GINEBRA	COSTA RICA.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO COMUNITARIO LAS ORQUIDEAS EN EL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA.

El proyecto correspondiente al Municipio de Andalucia cuenta con concepto técnico favorable por parte del Mecanismo Departamental de Viabilización.

➤ **Supervisión a proyectos y obras**

Atendiendo lo definido en el Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015 – Título 3, y el reglamento del Comité Directivo, Vallecaucana de Aguas debe ejercer, entre otras, la siguiente función: “Verificar el cumplimiento de los avances previstos en el Plan General y el Plan Anual Estratégico y de Inversiones, en lo relacionado con el componente de inversiones en infraestructura del PAEI (Obras y Diseños), y los componentes de aseguramiento de la prestación de los servicios, ambiental, gestión del riesgo sectorial, y residuos sólidos”.

En este sentido, los estudios y diseños actualmente en formulación y las obras que se encuentran en ejecución, contarán con su respectiva interventoría, la cual a su vez es supervisada por el área técnica. Para realizar esta labor de supervisión se contará con el apoyo de un grupo de profesionales expertos en las temáticas requeridas.

➤ **Mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua y saneamiento básico**

A la fecha de corte de este informe se tienen radicados en Ventanilla Departamental, 17 proyectos por valor de \$164.633 millones, ver tabla.

TABLA: PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL – FEBRERO 29 DE 2020

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
----	---------------------	-------

1	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN VILLA MARIANGEL, CORREGIMIENTO LA MARINA – MUNICIPIO TULUA, VALLE DEL CAUCA.	\$ 1.047.614.835,00
2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO LA MARINA, VEREDA EL CHUZO, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA	\$ 294.144.680,00
3	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO LA MARINA – VEREDA EL BRASIL , MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA	\$ 289.861.851,00
4	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DEL CAIRO	\$ 410.105.973,00
5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN GERARDO BAJO MUNICIPIO DEL CAICEDONIA	\$ 676.521.573,00
6	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL DOVIO	\$ 719.298.953,00
7	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO LA DORADA MUNICIPIO EL DOVIO	\$ 498.556.478,00
8	ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA CHAMBUSCADO, MUNICIPIO DE TULUA	\$ 945.184.141,00
9	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CORREGIMIENTO JIGUALES Y VEREDA EL REMOLINO, LA PRIMAVERA, LA CECILIA Y LA UNIÓN MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA	\$ 11.472.725.909,00
10	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE LA URIBE, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA	\$ 1.296.000.828,00
11	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS PARA LA VEREDA ALTA FLORIDA MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN – VALLE DEL CAUCA	\$ 1.094.574.339,00

12	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL	\$ 1.063.956.843,00
13	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA	\$ 1.040.871.473,00
14	DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PTAR LA TORRE Y PTAR LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	\$ 113.479.978.760,00
15	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO DE COSTA RICA Y LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA	\$ 5.738.128.254,00
16	OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 1 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URANO - CANDELARIA.	\$ 1.620.000.000,00
17	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE VENECIA - DISTRITO DE BUENAVENTURA.	\$ 22.945.737.336,00

4. COMPONENTE II: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

SUBCOMPONENTE: OBRAS

➤ Obras PDA en ejecución

Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto se encuentran contratadas veintitres (23) obras en los municipios de Yotoco, Guacarí, La Cumbre, Yumbo, Vijes, Obando, El Cerrito, Trujillo, La Unión, Obando, El Cerrito, Tuluá, Buenaventura, Trujillo, Restrepo, Argelia, Buga, Versalles y Calima Darien de las cuales tres (3) se encuentran terminadas o en proceso de liquidación y las Veinte (20) restantes se encuentran en ejecución, para un valor total de \$67.459.728.610 millones. Estos proyectos permitirán beneficiar a aproximadamente 198.303 habitantes, Ver Tablas .

Obras terminadas o en proceso de Liquidacion

Municipio	Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total	Poblacion Beneficida	Observaciones
-----------	----------	-----------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------

Tuluá	Construcción planta de tratamiento de agua potable y optimización del tanque alto de almacenamiento del corregimiento de Tres Esquinas, municipio de Tuluá - Departamento de Valle del Cauca			\$1.035.940.697	4.029	
Vijes	Construcción pozo de agua subterránea y sistema de bombeo para el abastecimiento del casco urbano – Fase 1			\$2.129.113.398	14.898	
Yotoco	Optimización del sistema de acueducto para el corregimiento de Mediacanoa - municipio de Yotoco			\$1.388.538.284	2.168	Se inician procesos de revisión jurídica de las actas para entrega protocolaria de obra.
TOTAL				\$4.553.592.379	21.095	

Id	Municipio	Proyecto	Valor total	Población	% avance
1	Yotoco	Construcción colectores de alcantarillado Cra 7 y Calle 6 con estructura de separación en el municipio de Yotoco	\$9.472.222.989	8.123	79%
2	Yumbo	Construcción de infraestructura para mitigar el desabastecimiento de agua potable en la zona urbana y rural del municipio de Yumbo, zona nororiental - Fase 1.	\$9.192.743.754	29.318	74%
3	La Cumbre	Construcción y ampliación del sistema de abastecimiento de agua del municipio de La Cumbre y las poblaciones cercanas de Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunia y Montañitas - Fase 1.	\$7.843.355.000	12.046	60%
4	Obando	Construcción para la optimización del sistema de acueducto y PTAP interveredal de San Isidro - El Chuzo, municipio de Obando	\$1.073.416.354	586	99%

Id	Municipio	Proyecto	Valor total	Población	% avance
5	Buenaventura	Fase 1, construcción de redes de acueductos para los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria, Distrito de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca	\$2.207.184.047	5.474	71%
6	El cerrito	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Tenerife - municipio de El Cerrito	\$1.435.325.436	704	98%
7	Trujillo	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Robledo - municipio de Trujillo	\$1.546.807.444	1063	48%
8	La Unión	Optimización del sistema de acueducto de la vereda pájaro de oro, en el corregimiento de la despensa en el municipio de la Unión	\$ 488744862	847	90%
9	Restrepo	Sistema de tratamiento de aguas residuales del barrio la Independencia municipio de Restrepo-Valle	\$ 966.030.871	500	2%
10	Argelia	Construcción para la optimización del sistema de acueducto interveredal y Ptap de los corregimientos San Roque, Raizal y La Aurora en el municipio de Argelia.	\$ 2.983.043.388	786	60%
11	Buga	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Alaska, municipio de Buga	\$ 549.307.160	577	15%
12	Buga	Colectores, Interceptores y Emisores Finales para los centros poblados de Quebrada seca, Manantial y la Zona de Expansión Sur en el Municipio de Guadalajara de Buga	\$ 3.494.050.616	98.203	76%
13	Bolívar	Construcción para la optimización de los sistemas de acueducto y PTAP del corregimiento Primavera de municipio de Bolívar, valle del cauca.	\$ 1.276.495.846	1.570	50%
14	Tulua	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable - PTAP para el corregimiento de Nariño, municipio de tulua.	\$1.026.327.435	4000	34%
15	Buga	Construcción sistema de tratamiento de agua potable Zanjon Hondo – Buga.	\$ 584.878.606	1.870	2%
16	Buenaventura	Rehabilitación de tubería de distribución del sistema de acueducto del corregimiento de Zaragoza, etapa 1 - Distrito de Buenaventura	\$ 675.939.565	1.406	91%

Id	Municipio	Proyecto	Valor total	Población	% avance
17	Guacari	Mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de la PTAR del corregimiento de guabas municipio de guacarí	\$13.256.105.061	3144	0%
18	Bolivar	Construcción de la línea de conexión del acueducto de la ptap del corregimiento de Ricaurte al corregimiento de la Herradura , y redes de distribución de agua de la herradura, municipio de Bolivar	\$ 1.135.068.270	1169	0%
19	Versalles	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario y construcción del alcantarillado pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio de Versalles - valle del cauca	\$ 3.150.681.485	5566	0%
20	Calima Darien	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para las manzanas t, l, l', u, u' del barrio la ciudadela german mejía tascón calima darién- valle del cauca	\$ 548.408.042	256	0%
		Total	\$ 62.906.136.231	177.208	

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ALCANTARILLADO CRA. 7 Y CALLE 6 CON ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO.

CONTRATO:	N° 200-13-05-006
FECHA DE INICIO:	JUNIO 19 DE 2014
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VALOR INICIAL:	\$ 6.321.652.309
VALOR FINAL ÚLTIMA ADICIÓN:	\$ 10.371.959.079
TOTAL ADICIONES EN TIEMPO:	DIECINUEVE (19) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	OCTUBRE DOCE (12) DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO YOTOCO 2014
REPRESENTANTE LEGAL:	Fernando José Castro spaddaffora
INTERVENTOR:	HIDRO-OCCIDENTE S.A
REPRESENTANTE LEGAL:	German Medina Scarpetta
ESTADO ACTUAL:	En Ejecución
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	79%

Se da reinicio a las obras las cuales se encontraban suspendidas debido a la ola invernal, con las tareas de: cerramiento, bombeo, acondicionamiento del área perimetral utilizando tela verde, igualmente se descubren las tuberías instaladas entre la estructura de la EBAR y el Cabezal de descarga sobre el río Cauca, es importante resaltar que las tuberías y el área en general se encontraba totalmente colmatadas con los lodos que se generan debido al alto nivel freático que se presenta en la zona.

Durante todo este periodo se hace necesario utilizar bombas eléctricas y Motor-Bombas diesel para poder abatir el nivel de las aguas subterráneas y dar inicio debidamente a las labores de construcción de las obras programadas. Durante este periodo básicamente se da reinicio a la excavación del área de la EBAR y se coloca el material de reemplazo, para estabilizar la cimentación de la estructura.



Cerramiento Utilizando Tela Verde Y Limpieza De Los Pozo De Sucion.



Alistamiento Y Conformain Del Carreteable , Adyacentes A La Ebar



EQUIPOS DE BOMBEO UTILIZADO PARA EL MANEJO DEL NIVEL FREATICO.




EXCAVACION PARA CIMENTAR AREA DONDE SE CONSTRUYE LA EBAR.

OBRA: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE TULUÁ - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO:	N°. 2000-13-05-008-2017
------------------	-------------------------

CONTRATISTA:	U.T. TRESESQUINAS
FECHA DE INICIO:	Enero 22 de 2018
PLAZO INICIAL:	Doce (15) Meses
VALOR INICIAL:	\$ 1.035.940.697
ADICION EN VALOR:	\$ 410.000.152
VALOR FINAL:	\$ 1.445.940.849
ADICION EN TIEMPO:	Cuatro (04) Meses
FCHA DE TERMINACION:	Octubre 19 de 2019
REPRESENTANTE LEGAL:	Gustavo Adolfo Lozano
INTERVENTOR:	Unión Temporal AGUAS VALLE 2018.
REPRESENTANTE LEGAL:	Sandra Milena Duque Muñoz
ESTADO ACTUAL:	Ejecución
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

Las actividades de obra fueron terminadas en su totalidad el día 19 de Diciembre de 2019, esta pendiente la liquidación del contrato de obra y su entrega al municipio de Tuluá.

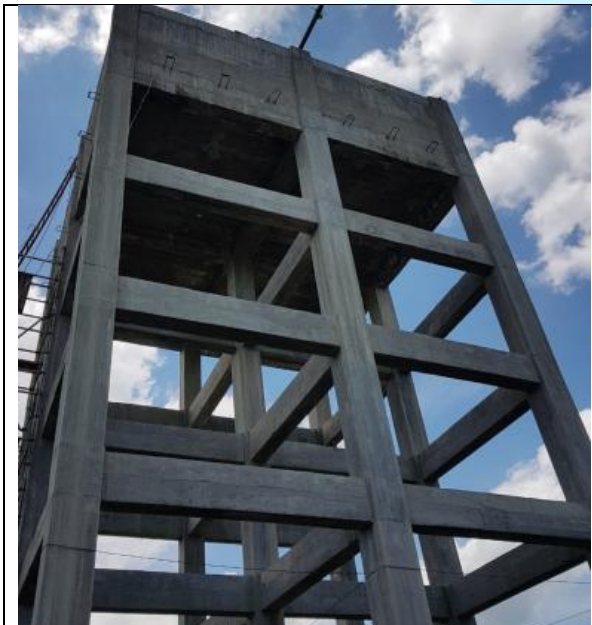

Terminado Su Reforzamiento Estructural Y Tanque De Almacenamiento.



Esstructuras De La Planta De Tratamiento, E Inicio De Las Instalaciones Hidraulicas.

OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, ZONA NORORIENTAL - FASE 1

CONTRATO DE OBRA N°	2000.13.05.009-2017
----------------------------	---------------------

CONTRATISTA	Consortio Aguas Del Valle
VALOR OBRA	\$ 8.215.116.755
FECHA DE FINALIZACION	20 DE MAYO 2020
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2000.13.04.005-2017
CONTRATISTA	Consortio Interventoría PTAP Yumbo 2017
VALOR INTERVENTORIA	\$ 660.478.560
VALOR ADICIONAL N°1 INTERVENTORIA	\$ 317.148.194
VALOR TOTAL N°1 INTERVENTORIA	\$ 977.626.754
FECHA DE FINALIZACION	23 de Junio 2020
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA	\$ 9.192.743.509
PORCENTAJE DE AVANCE	74.18 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020:

A la fecha la obra presenta un avance físico del 74.18 %

Se continúa trabajando en la instalación de los distintos componentes de la planta de potabilización de agua (PTAP), como es el caso de los dos clarificadores (pintura). se espera que durante el mes de marzo esté completamente instalada la planta.

Igualmente se adelantaron la instalación del cableado del sistema eléctrico, resta por ejecutar el cableado interno de las casetas, se continuo con la instalación de la mampostería, al igual que la fundición de las vigas de amarre de la caseta de impulsión y colocación de las cubiertas, la reparación de acabados caseta de operaciones, excavación, instalación de tubería, relleno, fundición de cajas y colocación de tapas del sistema eléctrico, a la fundición de muros de lechos de secado, sector N°. 1 y N°. 2, quedando pendiente el acabado final externo de estos muros, instalación de estructura metálica de cubierta de los lechos de secado sector N°. 1.; y a la llegada a la obra de las bombas de los sistemas de pozo e impulsión.

Llegan a la obra los transformadores de alta y baja tensión;

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCION: Comité técnico de obra



DESCRIPCION: Se observa la adecuación de la vía de acceso a la PTAP.



DESCRIPCION: Se Observan los trabajos que se adelantan en los dos (2) clarificadores



DESCRIPCION: Trabajos de mampostería y amarre de hierro para la viga de amarre de las casetas

OBRA: REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE OBRA N°:	2000.13.05.005-2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO ZARAGOZA
VALOR OBRA:	\$ 620.893.069
VALOR TOTAL OBRA:	\$ 620.893.069
FECHA DE FINALIZACION:	05 DE ABRIL 2020
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2000.13.12.002-2019
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL AGUAS DEL VALLE 2019

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:	\$ 50.042.248
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:	\$.50.042.248
FECHA DE FINALIZACION:	05 DE MAYO 2020
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA:	\$ 675.939.565
PORCENTAJE DE AVANCE:	91.00 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020:

El contratista a la fecha de emisión de este informe, realizo la instalación de la tubería PE PN 10 D= 75 mm y D=50 mm, que a la fecha le hacen falta realizar algunas domiciliarias, algunas termofusiones, conexión al tanque elevado del colegio, algunas adecuaciones en la conducción de la vereda el Oso, El 19 de febrero se realizó reunión con el comité de veeduría, en el cual se les explico el avance de la obra, se responde inquietudes de la comunidad, Se le explica que deben realizar las gestiones con la gobernadora para la fase III del proyecto. El 26 de febrero se realizó reunión a la cual asistieron el comité de veeduría, Contratista, Interventoría, supervisor, funcionarios de la SAAB y comunidad, Se realizo una contextualización del proyecto, (etapas y alcance), procedimiento de entrega del proyecto, entre otros.

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION: Se observa reunión comité técnico de obra



DESCRIPCION: Se observa reunión comité técnico de obra



DESCRIPCION: Se observa la instalación de acometidas



DESCRIPCION: Revisión trabajos ejecutados

OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑITAS - FASE 1.

CONTRATO DE OBRA N°:	2000.13.05.001-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS DEL VALLE
VALOR OBRA:	\$ 7.843.355.000
ADICIONAL N°1	\$ 1.795.414.615
VALOR TOTAL OBRA+ ADICIONAL:	\$ 9.638.769.615
FECHA DE SUSPENSION:	18/12/2019
FECHA DE FINALIZACION:	21 DE FEBRERO 2020
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2000.13.04.005-2017
CONTRATISTA:	Consortio Inteventoria Ptap Yumbo 2017
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:	\$ 625.464.000
VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 166.790.400
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:	\$. 792.254.400
FECHA DE SUSPENSION:	18 De Diciembre del 2019
FECHA DE FINALIZACION:	18 DE MARZO 2020
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA:	\$ 10.431.024.015
PORCENTAJE DE AVANCE:	60%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020:

La obra en el periodo correspondiente al mes de enero-febrero del 2020, se encontraba suspendida debido a que se están adelantando unos trámites relacionados con las servidumbres, en el frente de obra N° 1 Bocatoma, desarenador y caseta de impulsión. contempla tres (3) frentes de obra a saber:

- FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo
- FRENTE N°2: Línea de impulsión
- FRENTE N°3: PTAP

FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo

No se ha podido iniciar este frente de obra debido a que no se han superado los inconvenientes de cambio de trazado de la tubería de aducción, reubicación de la bocatoma y estación de bombeo, el contratista de obra inicia el alistamiento para acometer los trabajos en este frente.

FRENTE N°2: Línea de impulsión

La instalación de la línea de impulsión antes de la suspensión se encontraba en proceso de instalada de la tubería, instalación de las válvulas ventosas y purga, construcción de anclajes al igual que la construcción de cajas para válvulas.

FRENTE N°3: PTAP

En cuanto a este frente de obra a la fecha, se encuentra en proceso de construcción de la canaleta Parshall, el Floculador, sedimentador, al igual que los lechos de secado, se encuentran contruidos, en proceso constructivo el tanque Espesador de lodos, tanque de contacto de cloro, construido .

Durante la suspensión se visito l bodega donde se encuentran las motobombas del proyecto

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION: Se observan la visita a la bodega donde se encuentran las dos motobombas, después de llegar al país.



DESCRIPCION: Se observan las bombas del proyecto



DESCRIPCION: Se observa la señalización de las excavaciones al interior de la PTAP.



DESCRIPCION: Se observa la implementación de los protocolos de bioseguridad , punto de control

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ”

CONTRATO DE OBRA N°:	2000.13.05.006-2019
CONTRATISTA:	MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S
VALOR OBRA:	\$ 12.311.600.711
VALOR TOTAL OBRA	\$ 12.311.600.711
FECHA DE FINALIZACION:	05 DE MARZO 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2000.13.12.003-2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:	\$ 944.504.350

VALOR INTERVENTORIA:	\$.944.504.350
FECHA DE FINALIZACION:	05 DE ABRIL 2021
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA:	\$ 13.256.105.061
PORCENTAJE DE AVANCE:	0.00 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020:


Los días 7 y 20 de febrero se realizó comité técnico de obra, convocado por la interventoría, dicho se realizó en las instalaciones físicas de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, a dicho comité asistió personal de la interventoría, contratista, supervisión y el gerente y director técnico de Vallecaucana de Aguas.

El 5 de febrero se realizó visita al corregimiento de Guabas, con personal de interventoría, contratista y supervisión.

El 07 de febrero se realizó recorrido en el corregimiento de Guabas, con el alcalde y su grupo de trabajo, interventoría, contratista y supervisión al sitio donde se construirá la PTAR.

El 8 de febrero se realizó la presentación del personal del contratista, interventoría, supervisión y el proyecto a la comunidad del corregimiento de Guabas, a dicha socialización asistió además de la comunidad, la administración de Guacari en cabeza de su alcalde, personal de Vallecaucana de Aguas en cabeza del gerente, contratista, interventoría, concejales, grupos organizados entre otros. Los días 7 y 20 de febrero se realizaron los comités técnicos de obra, convocados por la interventoría, en las instalaciones físicas de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P

REGISTRO FOTOGRAFICO

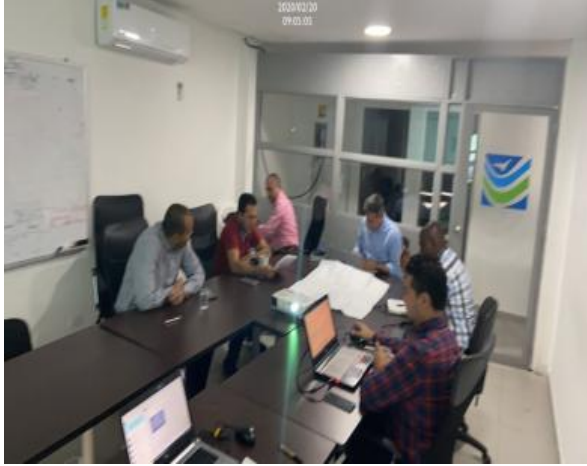

DESCRIPCION: Se observa la reunión de comité técnico de obra



DESCRIPCION: Reunión alcaldía de Guacari, tema servidumbres



DESCRIPCION: Socialización del proyecto a la comunidad de Guabas



DESCRIPCION: Socialización del proyecto a la comunidad de Guabas

OBRA: “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAUARTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR”

CONTRATO DE OBRA N°	2000.13.05.006-2019
CONTRATISTA	MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S
VALOR OBRA	\$ 1.050.841.420

VALOR TOTAL OBRA	\$ 1.050.841.420
FECHA DE FINALIZACION:	29 DE MARZO 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2000.13.12.003-2019
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	\$ 84.226.850
VALOR INTERVENTORIA	\$.84.226.850
FECHA DE FINALIZACION	05 DE ABRIL 2021
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA	\$ 1.135.068.270
PORCENTAJE DE AVANCE	0.00 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020:

Los días 2 y 7 de febrero se realizaron los comités técnicos de obra, en las instalaciones físicas de EVA. La interventoría solicitó información a Vallecana de Aguas S.A E.S.P. relacionada con el proyecto, contrato, pólizas, acta de inicio entre otros

El 05 de febrero se realizó reconocimiento del proyecto en el sitio, con personal de la administración municipal, concejales, contratista, interventoría y supervisión el acompañamiento del personal de ASERCOM.

REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>DESCRIPCION: Se observa el comité de obra, en las instalaciones físicas de EVA</p>	<p>DESCRIPCION: Se observa el comité de obra, en las instalaciones físicas de EVA</p>



DESCRIPCION: Reunión con funcionarios de la administración municipal, contratista, interventoría, supervisión y comunidad de La Herradura



DESCRIPCION: Reconocimiento del proyecto PTAP de Ricaurte

OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO – EL CHUZO DEL MUNICIPIO DE OBANDO

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del contrato adjudicado al CONSORCIO PTAP SAN ISIDRO 2017, suscrito bajo el N°2000.13.05.010-2017 del día 28 de diciembre de 2017, cuya acta de inicio se firma el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.

Se firma prorroga por 90 días calendario mediante Otrosí N° 1, el día 21 de enero de 2019.

Se firma prorroga por 30 días calendario mediante Otrosí N° 2, el día 12 de abril de 2019.

Se firma suspensión por un periodo de dos meses, el día 14 de mayo de 2019; reiniciando actividades el día 13 de junio de 2019.

Se firma prorroga por 30 días calendario, así como adición presupuestal por valor de Ciento Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos M/Cte (\$106.656.866), mediante Otrosí N° 3, el día 13 de junio de 2019.

Acta de terminación firmada el 19 de julio de 2019

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Continúan las actividades relacionadas con el recurso asignado para mayores cantidades y obras adicionales, La actividad continúa realizándose cumpliendo los parámetros de bioseguridad para este tipo de obras, pero a menor velocidad de lo planificado a causa de la pandemia de COVID 19 y la limitación de la movilidad intermunicipal y apertura de negocios lo cual afecta conseguir materiales; esta dificultad se da pese al Decreto 531 de 2020 numeral

18 que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de infraestructura durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional.

- Persiste el problema de que la Junta de operación del acueducto aún no está constituida, pero se está capacitando un fontanero de la zona de San Isidro en la operación del sistema que actualmente es pago por el contratista. Se reitera a la alcaldía la solicitud de apoyo en este tema, pues al menos se requieren dos, preferiblemente otro de la zona de El Chuzo.
- Se realiza el recorrido por las estructuras con la alcaldesa y funcionarios de la alcaldía, el director técnico y el director jurídico de Vallecaucana, contratistas e interventoría, representantes comunidad, verificando avances en compromisos.

AVANCE A LA FECHA: 99 % En proceso obras adicionales y mayores cantidades

REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión con contratista de obra, Gerente EVA, Director Jurídico, Interventoría
Para seguimiento de avances



Recorrido por infraestructuras con alcaldia municipal - Bocatoma



Recorrido por infraestructuras con alcaldia municipal - Desarenador



Recorrido por infraestructuras con alcaldia municipal – Filtro Grueso



Recorrido por infraestructuras con alcaldia municipal – Filtro lento



Recorrido por infraestructuras con alcaldia municipal – Tubería al tanque del Chuzo



Reunión con comunidad

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACUEDUCTO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE CÓRDOBA, SAN CIPRIANO, CITRONELA Y LA GLORIA - FASE I.

Contrato: No. 2000.13.05.007-2017 del 26 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, fecha de terminación del 22 de abril de 2019, con lo cual tiene un plazo de 15 meses para su ejecución, hasta la fecha sea prorrogado el tiempo en 10 meses para un total de 25 meses, con una suspensión de 1 mes desde el 20 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero de 2020. Con un avance total de obra del 71%.

El alcance del proyecto consiste en la construcción de las redes de acueducto para los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria del Distrito de Buenaventura, con el fin de ampliar la cobertura del servicio de agua potable a las poblaciones mencionadas. A continuación se presenta las actividades principales para la ejecución de la obra en cada uno de los centros poblados:

La Gloria

Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:

- Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm en un total de 1.733 metros
- La implementación de 2 macro medidores y 2 hidrantes de 3”.
- Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)
- Instalación de 109 acometidas

En esta localidad no se han ejecutado obras, debido a que la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura – SAABS.AE.S.P y la empresa HidropacificoS.A. E.S.P manifiestan que las tuberías contempladas en el diseño ya se encuentran instaladas y construir las redes de acuerdo a los diseños conllevaría a un detrimento patrimonial al Distrito de Buenaventura. Se han solicitado en múltiples ocasiones los planos y los puntos de empalme de las redes existentes para completar o extender estas redes.

El principal problema, asociado a la falta de agua potable, en el Centro Poblado de La Gloria es la falta de suministro por parte del operador, el cual solo suministra 2 horas de agua diaria al sector. Debido a estas circunstancias el taque existente no opera y la red nunca podrá ser balanceada.

San Cipriano

Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:

- Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm, en un total de 1714 metros.
- La implementación de 1 Macromedidor y 2 Hidrantes de 3”.
- Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)
- Instalación de 202 acometidas

La comunidad de San Cipriano al enterarse que solo se construirían 396 m lineales de tubería principal de los 1714 m lineales propuestos en diámetros mayores a 2”, manifestó que no dejará realizar las obras hasta que se les garantice que la totalidad de las obras serán construidas, como

consta en el acta levantada el día 19 de junio de 2018. A la fecha se ha instalado la totalidad de las tuberías y el 50% de las acometidas.

	
<p>Excavación para la instalación de tubería principal en el Centro Poblado de San Cipriano</p>	<p>Instalación de acometidas en el Centro Poblado de San Cipriano</p>

Citronela

Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:

- La extensión y reposición de redes existentes en PEAD 90 mm para un total de 3050 m
- El suministro e instalación de 3 macromedidores y 5 hidrantes de 3”.
- Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)
- Instalación de 166 acometidas

Actualmente se han instalado la totalidad de la tubería, y se terminaron la instalación de acometidas. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el macromedidor.

	
<p>Tubo instalado en Citronela</p>	<p>Lleno de tubería para prueba hidráulica</p>

Córdoba

Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:

- Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm (5.500 m) y HD 3" (575 m).
- La implementación de 1 macromedidor y 1 hidrante de 3".
- Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)
- Instalación de 327 acometidas

En el Centro Poblado de Córdoba se han instalado hasta la fecha 5250 metros lineales de tubería de 3" en PEAD, se han realizado 327 acometidas domiciliarias y se han pavimentado 699 m² en reposición de pavimento intervenido, de un total de 729 m². Una de las grandes dificultades en la obra es la interferencia de la comunidad. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el macromedidor.



Instalación de acometidas Córdoba



Instalación de tubería y relleno



Pavimentación



Arreglos solicitados por la comunidad

OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO

Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO TENERIFE 2017 y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.006-2017 el día 28 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.

Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 22 de abril de 2019.

Se formaliza mediante Otrosí N° 2, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 76 días calendario (2.5 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 8 de julio de 2019.

Se formaliza mediante Otrosí N° 3, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 7 de octubre de 2019.

Porcentaje de avance general: 98% No se presenta avance en este periodo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se realizan comunicaciones con el contratista a fin de que en concordancia con el Decreto 531 de 2020 numeral 18, que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de infraestructura durante la pandemia por COVID -19 se re inician las actividades, estas continúan suspendidas por parte del contratista, argumentando dificultad en consecución de materiales.

	
Floculadores	Instalación de compuertas



OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO.

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se continua realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en el corregimiento de Mediacanoa del municipio de Yotoco. Se realizan comités con la veeduría para chequear los avances en ajustes, posterior a los comités se realizan recorridos de obra para evidenciar físicamente estos avances en la obra e inconvenientes posibles que se puedan estar presentando.

Se firma prorroga por 60 días calendario, así como adición presupuestal por valor de Ciento Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Diecinueve Pesos M/Cte (\$198.492.019), mediante Otrosí N° 3, el día 13 de junio de 2019.

Acta de Terminación con pendientes firmada el 12 de agosto de 2019.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizan comunicaciones con el contratista a fin de que en concordancia con el Decreto 531 de 2020 numeral 18, que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de infraestructura durante la pandemia por COVID 19, se realicen los ajustes a compuertas de filtros, acción realizada por contratista cumpliendo los parámetros de bioseguridad para este tipo de obras y con esto culminan compromisos de obra para recibo por parte de la alcaldía.

Se inician procesos de revisión jurídica de las actas para entrega protocolaria de obra.

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO.

CONTRATO DE OBRA No.	2000.13.05.003-2018
Objeto:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, MUNICIPIO DE TRUJILLO
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO TRUJILLO 2018.
Interventor	UNION TEMPORAL AGUAS VALLE 2018
Acta inicio :	Julio 6 de 2018
Valor del contrato de obra	\$ 1.546.801.444
Otro si N° al contrato de obra	\$ 230.938.351

Valor Total Contrato de obra	\$ 1.777.739.795
Población beneficiada	1083 habitantes
Fecha de terminación	13 de Abril del 2020
Avance físico de la obra	48%

El avance de la obra está representando principalmente en adecuaciones de la caseta de operación y la planta de tratamiento de agua potable. Así mismo, el contratista de obra avanza en la atención de observaciones emitidas por la interventoría sobre la estructura de captación, la red de conducción y el sistema de tratamiento.

La interventoría, atendiendo solicitud del contratista, avala prórroga al contrato de obra por un término de 120 días, sustentada en motivos de fuerza mayor que incluyen condiciones climáticas adversas y el trámite ante el operador del servicio de energía eléctrica, para la aprobación del trazado de las redes eléctricas respectivas.

Registro Fotografico

	
Avance en caseta de operación	Avance en acondicionamiento de la zona de entrada y perimetral a la PTAP
	
Avance en línea de aducción	Comité tecnico de obra

OBRA: CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA SUBTERRANEA Y SISTEMA DE BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CASCO URBANO - MUNICIPIO DE VIJES - FASE I

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del contrato adjudicado a Jairo Martín Vargas Díaz, suscrito bajo el N° 2000.13.05.004-2018 del día 12 de octubre de 2018, cuya acta de inicio se firma el día 25 de octubre de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.

Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 60 días calendario (2 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 24 de diciembre de 2019.

A solicitud del contratista se firma Acta de Suspensión por un mes, el día 3 de diciembre de 2019, esto a causa de demoras por parte de EPSA para la conexión del pozo al sistema eléctrico, en el entendido que esta actividad está fuera del control del contratista.

Se firma acta de reinicio de obra el día 3 de enero de 2020.

Acta de terminación del 24 de enero de 2020.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se continúan acciones en pro de verificar responsabilidades del contratista en el daño de la obra y procedimiento a seguir para corrección de la situación, esto a través de múltiples reuniones de seguimiento entre directivos de Vallecaucana de Aguas, Contratista de obra, Acuavalle e Interventoría, manteniendo informado al alcalde de las decisiones tomadas.

Se desmonta el motor y se argumenta por parte del contratista que el daño del motor de la bomba obedece a variaciones e incremento de voltaje en el servicio prestado por CELSIA en la localidad, se procede por parte del contratista a la compra de un nuevo equipo mientras se verifica este argumento, a fin de restaurar el servicio del pozo al sistema, con el compromiso que si se verifica que no tuvo responsabilidad se le apoyará en una futura reclamación contra CELSIA.


Director jurídico de EVA solicita que Acuavalle efectúe con sus profesionales correspondientes un análisis de la afectación del sistema, a fin de contar con el concepto técnico de un tercero que pueda ser considerado neutral, así como se debe solicitar a CELSIA un informe de las variaciones de energía presentadas en el periodo de tiempo en que se dio el daño del motor.

A inicios de junio se instala nuevamente la bomba en compañía de Acuavalle quien recibe a satisfacción y durante el periodo que corresponde a este informe no se reciben mas novedades respecto al funcionamiento del sistema.

Todas estas actividades se realizan cumpliendo los parámetros de bioseguridad para este tipo de obras, en el marco de la pandemia por COVID-19.

AVANCE A LA FECHA: 100 %

REGISTRO FOTOGRAFICO

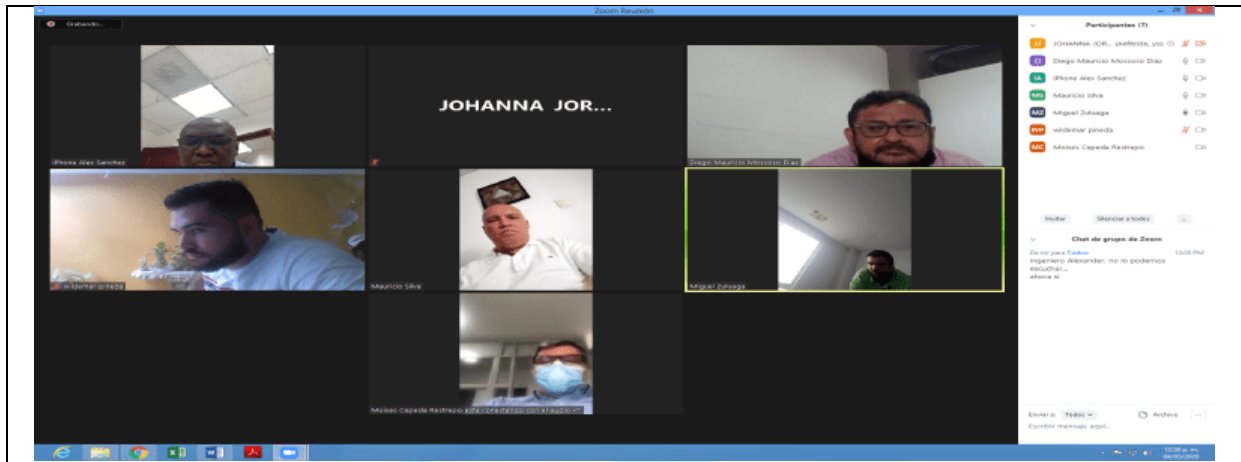

Reunión contratista, interventoría, directivos Vallecaucana de Aguas



Reunión contratista, interventoría, directivos Vallecaucana de Aguas

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PÁJARO DE ORO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN

Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al señor WILDER BARONA TRIANA y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.001-2019 el día 02 de enero de 2019. Se firmó el acta de inicio el día 28 de febrero de 2019, con un plazo de 12 meses para su ejecución.

Se continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en la vereda de Pájaro de Oro del municipio de la Unión. Se llevan a cabo estos comités de obra cada 15 días y un comité con la veeduría una vez al mes.

Actividades desarrolladas:

Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecana de Aguas S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades

El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

- Construcción de un desarenador.
- Construcción de una PTAP compacta de 2 l/s.
- Optimización de la red de distribución: 2500 ML en tubería de 2" 100 Alta Densidad RDE 17-PN10 145 PSI.
- Acometidas domiciliarias: 142 unidades.

Falta por instalar:

- Construcción de la caseta con la instalación eléctrica para las bombas dosificadoras.
- Construcción cerramiento de la obra.
- Profundización de 100 m de la tubería que sale del Tanque de Almacenamiento por solicitud de la comunidad.
- Instalación de 2 hidrantes.

Porcentaje de avance: 90%



Instalación PTAP



Construcción Desarenador



Instalación de acometidas



Instalación de tubería

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZANJÓN HONDO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al consorcio Agua Pura 2019 y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.004-2019 el día 29 de marzo de 2019. Se firmó el acta de inicio el día 05 de junio de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.

Actividades desarrolladas:

Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

- ✓ Se realiza reunión entre el contratista, la firma interventora de la obra y Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, con el fin de revisar los planos y documentos correspondientes a los diseños del proyecto, de tal forma de que las observaciones pertinentes se relacionen en el informe cero.
- ✓ Se llevó a cabo reunión en la Alcaldía del Municipio de Guadalajara de Buga, a la cual asistieron los contratistas encargados de ejecutar la obra, el personal de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y el Secretario de Obras Públicas, con el fin de presentar las firmas encargadas de la ejecución del proyecto.
- ✓ Se llevó a cabo reunión con la comunidad para socialización de la obra, los alcances de la misma y la presentación de los contratistas. Así como también se conformó el comité veedor de la obra.
- ✓ Se establece que los comités de obra serán cada 15 días en campo. Así como también se realiza un comité con la veeduría una vez al mes.
- ✓ La firma interventora hace entrega del informe cero.

Porcentaje de avance: 2%

Registro Fotografico



Presentación de Contratistas ante el Municipio



Presentación de Contratistas ante la comunidad de Zanjón Hondo



Presentación de Contratistas ante la comunidad de Zanjón Hondo



Reunión de seguimiento de la obra y entrega de informe cero.

OBRA: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO-VALLE

Porcentaje de avance: 2%

La obra fue contratada mediante Licitación Pública No. 2000.46.01.016-2018, Contrato de Obra No. 2000.13.05.01-2019 representante Legal Ingeniero Wilder Barona Triana y Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2019 con HIDROCCIDENTE SA No. Por un Valor \$ 966.030.87,

Firma de Contrato: 02-01-2019

Acta Inicio Interventoría: HIDROCCIDENTE (27-02-2019)

Acta de Contratista: Ing. Wilder Barona Triana (28-02-2019)

Plazo: 12 Meses

Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- Reunión de presentación del contratista e Interventoría a la Administración Municipal Restrepo.
- Socialización y presentación del Alcance del Contrato y la obra a ejecutar por parte del Contratista e Interventoría a la Comunidad usuaria del mismo – Barrio La Independencia.
- Se realizó visita de campo al predio donde se ejecutará la Obra, entregando Informe cero la Interventoría.
- Se realiza reunión Interdisciplinaria con el Contratista, Interventoría, Supervisión de Vallecaucana de Aguas, Profesional Social y SISO de las tres empresas, verificando protocolos, formatos para la trazabilidad de las convocatorias, e informes.



Socialización Presentación Contratista , Interventoría y proyecto a Ejecutar



Presentacion en Municipio Restrepo



Visita a Predio Contratista e Interventoría y Comunidad



Reunion de Obra en Predio



Reunión en CVC-Gestión Ambiental

Fuente: Registro Supervisor EVA

OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.

Mediante licitación pública No. 2000.46.02.001-2018, se adjudicó el proyecto a la firma constructora CONSORCIO ARGELIA 2019 y se suscribió el contrato de obra No. 2000.13.05.003-2019 el día 4 de febrero de 2019, se firmó acta de inicio el día 28 de febrero de 2019, fecha de terminación del 27 de diciembre de 2019, con lo cual tiene un plazo de 10 meses para su ejecución. El valor total de la obra es de \$ 2.983.043.388, con una población beneficiada de 718 habitantes. El alcance del proyecto consiste en la construcción de la Bocatoma sobre la quebrada Los Chorros, el Desarenador, PTAP tipo FIME, Tanque de Almacenamiento, Caseta de Fontanero y las Obras de Protección, y la instalación de 17 m de tubería de Aducción, de 7.553 m de tubería de Conducción, de 2550 de tubería en la Red de Distribución y de 25 Acometidas. Hasta la fecha se han realizado la obra de la Bocatoma y el Desarenador, junto a la instalación de 7000 metros lineales de conducción. Se ha construido un muro de contención como medida de mitigación para evitar el deslizamiento de la bancada.

Porcentaje de avance: 60%

	
<p>Foto Bocatoma Acueducto Interveredal Argelia</p>	<p>Foto Desarenador del Acueducto Interveredal Argelia</p>
	
<p>Foto Construcción Muro de Contención Acueducto Interveredal Argelia</p>	<p>Foto Excavación para la instalación de tubería</p>

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP DE LA VEREDA ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA

Contrato de Obra N° 2000.13.05.002 – 2019 del día 25 de enero de 2019, se firmó acta de inicio el día 28 de febrero de 2018, con un plazo de 10 meses para su ejecución.

Actividades realizadas

Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo de este informe (Julio- Agosto 2019) con el acompañamiento de la interventoría y la Supervisión de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades:


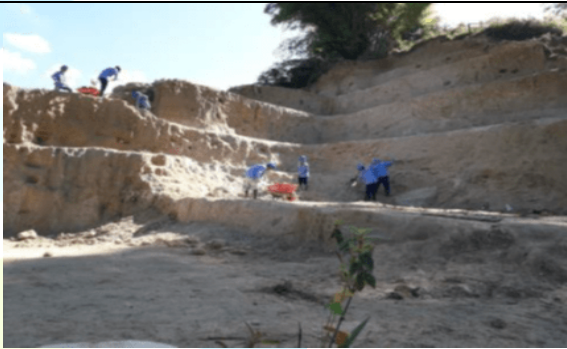


- Se realiza levantamiento topográfico para una nueva línea de aducción desde la Bocatoma hasta la PTAP.
- Se continúa con la excavación a mano en la zona de construcción de la PTAP y se está figurando el acero de refuerzo para los filtros de la PTAP.
- En la construcción de la unidades Sanitarias y STAR nuevo, se instala la perfilera para la cubierta, pisos, puertas y aparatos sanitarios en las baterías sanitarias. Se inicia con la

adecuación de las unidades sanitarias y STAR nuevo en la casa del señor Alexander Jaramillo y el señor Mesías Valencia, donde se instalan los aparatos sanitarios, lavamanos, ducha, lavadero y se instala una STAR nueva.

- Se construyeron nuevos trinchos en madera, para contener los volúmenes de tierra excavada en la zona de construcción de la PTAP y de esta manera evitar deslizamientos que afecten los terrenos vecinos.
- Se han realizado Comités de Obra y visitas técnicas los cuales se llevan a cabo cada 15 días y un comité con la veeduría una vez al mes.
- Se está trabajando en el manejo que se le dará a los taludes de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos inicial, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.
- Se inicia con el armado en sitio de acero de refuerzo para el Filtro Dinámico.
- Se fundió solado en filtro grueso ascendente.

Las actividades ejecutadas por el contratista de obra, fueron verificadas y revisadas por la interventoría, la cual está a cargo del Consorcio Hidro-Occidente S.A.

Porcentaje de ejecución: 15.08%

	
<p>Excavación zona PTAP nivel cero.</p>	<p>Manejo de taludes para PTAP.</p>
	
<p>Excavación Manual Filtro Dinámico</p>	<p>Solado Filtro Dinámico</p>

	
<p>Acero de refuerzo filtro dinámico</p>	<p>Excavación manual filtro grueso ascendente</p>
	
<p>Inst. aparato sanitario y enchape Bateria sanitaria nueva</p>	<p>Instalación puerta Bateria Sanitaria vivienda Mesias Valencia.</p>
	
<p>Construcción lavadero vivienda MesiasValencia</p>	<p>Trampa Grasas y Tanq. Septico viviendaAlexander Jaramillo.</p>
	
<p>Trinchera en madera varios niveles</p>	

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (INCLUYE PTAP) PARA EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE TULUÁ

Como actividad continua por parte de Vallecana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2019), se continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del contrato adjudicado al CONSORCIO AGUA PURA, suscrito bajo el N° 2000.13.05.004-2019 del día 29 de marzo de 2019, cuya acta de inicio se firma el día 05 de junio de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.

Obra con Acta de Suspensión a causa de la Pandemia por COVID-19, fecha del 24 de marzo de 2020.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Por indicaciones de directivos jurídico y técnico, y en concordancia con el Decreto 531 de 2020 numeral 18 que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de infraestructura durante la pandemia por COVID 19, se inicia durante este periodo el proceso de formulación de protocolos de bioseguridad, que son los protocolos que dan vía libre a las obras en ejecución a fin de garantizar la salud del personal que trabaja en la ejecución de estos proyectos.

Se apoya la gestión en recopilación de documentos, a fin de que puedan contar con el visto bueno de su ARL y por consiguiente de Vallecana de Aguas, para reinicio de obra.

Se realiza reunión con funcionarios de nueva administración de Emtulua S.A E.S.P, quienes solicitan articular el tanque alto en proceso de construcción por parte de ellos, con la PTAP Nariño contratada por el PDA; se les exponen antecedentes del proceso con anterior administración municipal y de Emtulua y sus demoras en atender las solicitudes, y que a esta fecha se dificulta articular las dos obras y por lo tanto la PTAP Nariño se construirá conforme el diseño en todos sus componentes.

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 34 %

REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión tanque alto de almacenamiento de Emtulua S.A E.S.P

OBRA: COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADA SECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

Contrato: Obra N° 2000.13.05.002 – 2019 del 25 de enero de 2019, se firmó acta de inicio el día 2 de febrero de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.

El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

- ✓ Excavaciones a máquina de pozo de EBAR.
- ✓ Solado para placa fondo EBAR
- ✓ Instalación de tubería conducción quebrada seca parte alta y media.
- ✓ Armado de hierro para placa fondo en concreto de pozo de EBAR.
- ✓ Figuración de acero de refuerzo para muros de pozo de succión de EBAR.

Adicionalmente, se continúa realizando las visitas técnicas y comités de obra en el Municipio de Buga. Se llevan a cabo estos comités de obra cada 15 días y un comité con la veeduría una vez al mes.

El porcentaje de ejecución a la fecha corresponde a un 76.12%.

	
<p>Comité Técnico y de Veeduría</p>	<p>Manejo de taludes succión EBAR</p>
	
<p>Excavación a máquina tramo IMCA.</p>	<p>Acero de refuerzo muros pozo de succión EBAR</p>

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, (INCLUYE PTAP), DEL CORREGIMIENTO DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR.

<p>CONTRATO DE OBRA No.</p>	<p>2000.13.05.004-2019</p>
<p>Objeto:</p>	<p>Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para: construcción para la optimización del sistema de acueducto (incluye PTAP), del corregimiento de primavera del municipio de Bolívar; sistema de acueducto (incluye PTAP) para el corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá y construcción del sistema de tratamiento de agua potable del corregimiento Zanjón Hondo en el municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca.</p>
<p>Proyecto:</p>	<p>Optimización del sistema de acueducto (incluye PTAP), del corregimiento de primavera del municipio de Bolívar.</p>

Contratista:	CONSORCIO AGUA PURA 2019
Interventor	UNIÓN TEMPORAL AGUAS VALLE 2019
Acta inicio :	Junio 5 de 2019
Valor del contrato de obra	\$ 2.887.701.887
Valor proyecto Primavera	\$ 1.276.495.846
Avance físico de la obra	50,70%
Población beneficiada	1570 habitantes
Fecha de terminación	5/04/2020

El día 23 de Enero de 2020 Se realiza en Vallec aucana de Aguas S.A. E.S.P. la audiencia por presunto incumplimiento al Contratista Consorcio Agua Pura 2019. El avance de la obra está representando principalmente en Bocatoma la Grecia, Red de distribución, Tanque de almacenamiento y adecuaciones e instalaciones PTAP.

Registro Fotografico



Avance en estructura de captación y desarenador

Avance en red de distribución

Avance en tanque de almacenamiento

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS MANZANAS T, L, L´, U, U´ DEL BARRIO LA CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN CALIMA DARIÉN- VALLE DEL CAUCA

CONTRATO N°:	2000.13.05.008.2019	
FECHA DEL CONTRATO:	24 de diciembre de 2019	
OBJETO:	"Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para el "construcción de redes de acueducto y alcantarillado para las manzanas t, l, l´, u, u´ del barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- Valle del Cauca".	
VALOR:	\$ 539.460.878	
PLAZO:	cuatro (04) meses	
FECHA DE INICIO:	17/01/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/05/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25/03/2020	
FECHA DE REINICIO:	13/07/2020	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	4/09/2020	
SUPERVISOR	Nombre	Miguel E. Zuluaga Montero
	Cargo	Director Tecnico
INTERVENTOR	Razón Social Contratista	Consorcio Calima-Versalles
	NIT	901.351.151-8
	Nombre Representante Legal	Rodrigo Martinez Osorio
CONTRATISTA /	Razón Social Contratista	Consorcio German Mejia 2019
ENTIDAD	NIT	901.350.535-8
	Nombre Representante Legal	Diego Fernando Zarate

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.008.2019 cuyo objeto consiste en la “construcción de redes de acueducto y alcantarillado para las manzanas T, L, L’, U, U’ del barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- Valle del Cauca”, en el periodo enero-febrero de 2020 son las siguientes:


- Se suscribió el acta de inicio entre Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. y la firma interventora Consorcio Calima-Versalles, con fecha del 13 de enero de 2020.
- Se suscribió el acta de inicio entre Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. y el contratista Consorcio German Mejía 2019, con fecha del 17 de enero de 2020.
- Se realiza el trámite y aprobación de las pólizas del consorcio Calima-Versalles y Consorcio German Mejía 2019.
- El 4 de febrero de 2020 se realizó la socialización del proyecto ante la administración municipal de Calima El Darién.
- La interventoría hizo entrega de oficios de solicitudes realizadas al contratista, tales como: plan de calidad de la obra, informe cero y cronograma de obra.
- El 20 de febrero de 2020 en la casa de la cultura se realizó la socialización del inicio de obra ante la comunidad y a la administración municipal de Calima El Darién. Se realizó una visita al predio de la obra.

Se tiene como avance de la obra hasta la fecha del presente informe:

- ✓ Avance físico a fecha de corte del informe: 0%.
- ✓ Avance financiero a fecha de corte del informe: 0%.

Registro Fotografico

PAP-PDA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG-MIG)		LISTADO DE ASISTENCIA	
FECHA:	2020 FEB 20	HORA INICIAL:	3:00 P.M.	HORA FINAL:	
OBJETIVO:			LUGAR: Alcaldía Calima Darién		
Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Carrera Electrónica	Firma
1	Rodrigo Mattin	Interventoría	316977093	rodrigo.mattin@interventoria.com	[Firma]
2	Rafael A. Cardona C	Vallecaucana	3163581793	rafael.cardona@vallecauca.com	[Firma]
3	Gerardo Rivas	Interventoría	3159836215	gerardo.rivas@interventoria.com	[Firma]
4	Diego Caldera V	Vallecaucana	310777092	diego.caldera@vallecauca.com	[Firma]
5	Alfonso Mejía	Alcaldía	310777092	alfonso.mejia@calima.gov.co	[Firma]
6	Kelly X. Bunka Alvarado	Interventoría	316977093	kelly.bunka@interventoria.com	[Firma]
7	Diego Velasco R	Interventoría	316977093	diego.velasco@interventoria.com	[Firma]
8	Diego Velasco R	Interventoría	316977093	diego.velasco@interventoria.com	[Firma]
9	Diego Velasco R	Interventoría	316977093	diego.velasco@interventoria.com	[Firma]
10	Diego Velasco R	Interventoría	316977093	diego.velasco@interventoria.com	[Firma]
11	Diego Velasco R	Interventoría	316977093	diego.velasco@interventoria.com	[Firma]
12					
13					
14					
15					



Listado de Asistencia de la Socialización a la alcaldía

Vista general lote Ciudadela Germán Mejía Tascón

	
<p>Socialización inicio de obra a la comunidad y alcaldía</p>	<p>Socialización inicio de obra a la comunidad y alcaldía</p>
	
<p>Visita al lote de la obra, contratista-veeduría-Vallecaucana</p>	

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE 1 - DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES-VALLE DEL CAUCA

CONTRATO N°:	2000.13.05.007.2019
FECHA DEL CONTRATO:	3/12/2019
OBJETO:	"Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "la optimización del sistema de alcantarillado sanitario y construcción del alcantarillado pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio de Versalles-Valle del Cauca"
VALOR:	\$ 3.150.681.485
PLAZO:	OCHO (08) MESES

FECHA DE INICIO:	18/01/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/09/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25/03/2020	
FECHA DE REINICIO:	18/05/2020	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10/11/2020	
SUPERVISOR	Nombre	Miguel E. Zuluaga Montero
	Cargo	Director Tecnico
INTERVENTOR	Razón Social Contratista	Consortio Calima-Versalles
	NIT	901.351.151-8
	Nombre Representante Legal	Rodrigo Martinez Osorio
CONTRATISTA	Razón Social Contratista	Unión Temporal Colector Pluvial Versalles
ENTIDAD	NIT	901.344.929-1
	Nombre Representante Legal	ANDRES FELIPE OSPINA GALINDO

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.007.2019 cuyo objeto consiste en la “optimización del sistema de alcantarillado sanitario y construcción del alcantarillado pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio de Versalles–Valle del Cauca”, en el periodo enero-febrero de 2020 son las siguientes:

- Se suscribió el acta de inicio entre Vallecáucana de Aguas S.A E.S.P. y la firma interventora Consorcio Calima-Versalles (CCV), con fecha del 13 de enero de 2020.
- Se suscribió el acta de inicio entre Vallecáucana de Aguas S.A E.S.P. y el contratista Union Temporal Colector Pluvial Versalles (UTCPV), con fecha del 18 de enero de 2020.
- Se realizó el trámite y aprobación de las pólizas del consorcio Calima-Versalles y Union Temporal Colector Pluvial Versalles.
- Personal del contratista UTCPV, la empresa Camino Verde y Planeación municipal de Versalles realizo un recorrido por los tramos a intervenir.
- El 18 de febrero de 2020 en la casa de la cultura se realizo la socializacion del inicio de obra ante la comunidad y la administracion municipal de Versalles. }
- El 25 de febrero de 2020 el contratista UTCPV entrego el informe cero a Vallecáucana de Aguas. De acuerdo con este documento, las actividades realizadas en campo permitieron evidenciar que algunos tramos de alcantarillado ya han sido reemplazados mientras que otros están proyectados sobre viviendas existentes, estructuras como puentes, muros de contención o zonas con fuertes pendientes, movimiento en masa o riesgo de inundación, haciendo necesario realizar ajustes a los diseños.

- El 28 de febrero de 2020 se realizó una reunión en Vallecaucana de Aguas entre la interventoría CCV, el contratista UTCPV y el supervisor de la obra. El objetivo de la reunión fue discutir los resultados presentados en el informe cero y la solicitud de autorización de inicio de obra en los tramos 5, 6 y 7 del alcantarillado pluvial, presentada por el contratista.
- Se elaboraron las actas de vecindad de tres tramos en los cuales se iniciara la intervención.
}
- Se llevó a cabo la postulación de las personas que quieren formar parte del comité veedor.
Se tiene como avance de la obra hasta la fecha del presente informe:

- ✓ **Avance físico a fecha de corte del informe: 0%**
- ✓ **Avance financiero a fecha de corte del informe: 0%**

Registro Fotografico



Recorrido por los tramos a intervenir



Actas de vecindad



Socialización inicio de obra ante la comunidad y alcaldía

4.4 Sub componente: Estudios y Diseños

- **Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias**

Durante la vigencia 2017 se priorizaron en conversatorios comunitarios y se contrataron once (11) estudios y diseños para nueve (9) municipios, por un valor de \$ 2.853,7 Millones, Ver Tabla. La consultoría fue reiniciada el día 19 de Junio del 2019 y se fijó como nueva fecha de terminación el día 02 de Diciembre de 2019.

TABLA: ESTUDIOS Y DISEÑOS - VIGENCIA 2017

N.º	MUNICIPIO	PROYECTO
1	Ansermanuevo	Estudios y Diseños para la optimización del sistema de abastecimiento de Agua para las veredas El Roble, San Agustín, La quiebra, El Cipres, Lusitania, Diamantina, Santa Barbara, La Puerta y Tres Esquinas de ACUAROBLES, Municipio de Ansermanuevo.
2	Versalles	Estudios y Diseños para el acueducto Interveredal para las poblaciones de La Aurora, Buenavista y El vergel
3	El Águila	Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la Vereda El Embal
4	El Dovio	Estudios y diseños para el acueducto Interveredal para las poblaciones de: Caño Hondo, La Cabaña, El Lulal, El Crucero y la comunidad Indígena Umadamia
5	San Pedro	Estudios y diseños para la optimización del sistema del abastecimiento de agua y la optimización del sistema de alcantarillado para el corregimiento de San Jose
6	La Cumbre	Estudios y diseños para la optimización del acueducto Interveredal y diseño de PTAP, para las poblaciones de Puente Palo y poblaciones anexas (17) en el municipio de La Cumbre.
7		Estudios y diseños para la optimización del acueducto Interveredal de las poblaciones de Jiguales, La Ventura, El Carmen y la Cuchilla
8	Pradera	Estudios y Diseños para la optimización del Sistema de Acueducto y PTAP para el Corregimiento El Recreo, Municipio de Pradera
9	Florida	Estudios y Diseños para la optimización del Alcantarillado y la PTAR del corregimiento de El Llanito
10	Florida	Estudios y Diseños para el Alcantarillado y PTAR de la vereda Cañas Abajo
11	Buenaventura	Estudios y diseños para el sistema de acueducto y PTAP para el corregimiento de Bajo-Calima

La suspensión se ocasionó por el fallecimiento del representante legal y consorciado con el mayor porcentaje de participación el Ing. Juan Diego Peña. A la fecha se está adelantando la cesión de la participación del Ingeniero en la conformación del consorcio, proceso que se encuentra en revisión en el área jurídica de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.

A la fecha el contrato presenta el siguiente estado desde el punto de vista legal:

Fecha de inicio:	07 de diciembre de 2017
Fecha de terminación inicial:	08/10/2018
Contrato adicional en tiempo N°1	120 días
Acta de Suspensión N°1:	22/03/2019
Acta de Reinicio:	19/06/2019
Acta de Suspensión N°2:	02/02/2020
Acta de Reinicio:	03/03/2020
Nueva fecha de terminación:	03/03/2020

Productos Entregados: La consultoría a la fecha ha entregado los productos 1 (Fase I. Actividades Preliminares, Catastro, Diagnóstico, e identificación predial.) y 2 (Fase II. Planteamiento, Selección de Alternativas, Gestión de Trámites y Permisos (Parte I), correspondientes a cada uno de los 11 estudios y diseños, con un avance de 40% de ejecución.

Plan Maestro de Alcantarillado de Buenaventura – Obras prioritarias Primera Fase

El proyecto que se encuentra en proceso de ejecución, comprende:

- La formulación del Plan Maestro para el Sistema de Alcantarillado del Distrito de Buenaventura – Zona urbana incluyendo la Gloria – Citronela y la Caucana. Etapa de identificación de la solución al problema de saneamiento básico.
- La elaboración de los planes, estudios y diseños detallados de los proyectos que fueron priorizados para la Primera Fase del Plan Maestro de Alcantarillado. Etapa de diseño, presupuesto inversión, viabilización y aprobación del proyecto de saneamiento básico para financiación de la Nación.

La alternativa propuesta en el Plan Maestro, a partir de la existencia de 800 puntos de descarga de vertimientos, es la agrupación en 6 Macrosistemas, y la construcción de 2 PTAR, una en Lleras y la otra en el Olímpico, en un proceso por fases. El gobierno nacional se comprometió a financiar los recursos adicionales para completar la primera fase, vía créditos con la CAF y el BID, para diseños y obras de conformidad con los recursos aprobados en las actas de compromiso con el Comité del paro cívico de Buenaventura.

Luego de un proceso de concertación social y coordinación interinstitucional, actualmente se avanza en la ingeniería de detalle de la primera fase de los diseños priorizados para los sectores de la Isla y el continente.

En la actualidad se avanza en el proceso de diseños de ingeniería a detalle de las obras del sector insular (Diseños estructurales, eléctricos, hidráulicos). Igualmente, del sistema 3 zona continental. También se está realizando de manera simultánea la gestión predial de las áreas donde se localizarán las estructuras.

Estado legal del contrato con la firma consultora: “UNION TEMPORAL AQUAPOZOS”

Contrato de consultoría No 200-13-04-010-2015

Contratista: Unión Temporal Aquapozos

Plazo inicial: 22 meses

Fecha de Inicio: Octubre 07 de 2015

Fecha de terminación: 08 de agosto de 2017

Fecha de suspensión: 02 de agosto de 2017

Fecha de reinicio: 01 de diciembre de 2017

Fecha de Suscripción Otrosí No 1: 06 de diciembre de 2017 Amplia el plazo por 8 meses

Fecha de terminación: 13 de agosto de 2018

Fecha de suscripción Otrosí No 2: 10 de agosto de 2018 Amplia el plazo por 5 meses y 16 días

Fecha de terminación: 29 de enero de 2019.

Fecha de Suscripción Otrosí No 3: 17 de enero de 2017 que Amplía el plazo a un mes y medio

Fecha de terminación: 15 de marzo de 2019

Fecha de suscripción Otrosí No 4: 14 de marzo de 2019 ampliando el plazo del contrato por termino de tres meses y medio (31/2 meses).

Fecha de terminación: 02 de julio de 2019.

Además se suscribió otrosí el 21 de febrero de 2018 para atender la actualización del PMA (Resolución 0330 de 2017). Según lo establecido en el Otrosí No 2 las fechas de entrega de los Productos:del Componente 2 sería la siguiente:

COMPONENTE2	
PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
PRODUCTO 3	
DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADA	30/05/2019
PRODUCTO 4	
TRAMITES Y PERMISOS PARTE II	30/05/2019
PRODUCTO 5	
VIABILIZACIÓN DE PROYECTO ANTE EL MVCT	28/06/2019

Es importante resaltar que el proyecto se encuentra en la fase de diseño de Ingeniería de detalle. El avance de ejecución del proyecto es del 82%.

Debido a las exigencias realizadas por los funcionarios de las Instituciones: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD, Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAAB, Hidropacífico entidad que opera los servicios públicos en el distrito de Buenaventura, en las reuniones Interinstitucionales realizadas en el salón de juntas de Vallecana de Aguas, solicitaron que se estudie la posibilidad de reducir los diámetros de los Colectores que se proyecten.

Fue necesario volver a plantear por parte de los Consultores diferentes alternativas con respeto a las curvas, Intensidad, frecuencia, duración, IFD para diferentes años, de acuerdo al régimen pluviométrico que se presenta en este puerto sobre el pacífico. Esto incidió en la demora en la entrega de los productos por parte de los diseñadores, motivando que la firma consultora se viera abocada a solicitar una reprogramación para la entrega de los productos faltantes, solicitud que fue aceptada por la Interventoría y la Supervisión de Vallecana. En la actualidad se encuentra en proceso de ampliación del plazo por parte de la Oficina de Jurídica.

Los consultores se comprometen a entregar el proyecto, si no deben sortear otras alternativas en los diseños a finales del mes de noviembre del año en curso.


El avance de ejecución del proyecto es del 85%. La entrega final de los diseños está prevista para el 1 de noviembre ante el MVCT, para surtir el trámite de evaluación y viabilización ante Ventanilla Nacional.



Reunion Interinstitucional Con La Participacion De Los Representantes De Diferentes Entidades, Interesadas En Los Dideños Del Plan Maestro De Alcantarillado De Buenaventura.



Reunion En La Ciudad De Buenaventura Con La Participacion De Los Representantes De La Entidades Y La Comuidad Bonaverense.

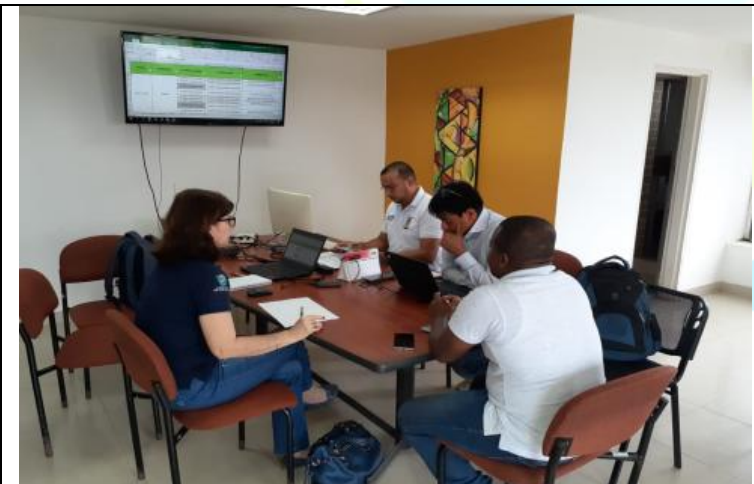

GESTIÓN PRE4DIAL

5. COMPONENTE III: AMBIENTAL

5.1 Sub Componente: Mínimos Ambientales

➤ Apoyo al cumplimiento y seguimiento de mínimos ambientales

Se formaliza la liquidación del contrato previamente celebrado para la vigencia 2019, en los siguientes términos:

Contratista: Eointegral Ltda.

Contrato N°: 2000.13.04.002-2019

Objeto: Realizar el ajuste y formulación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV-, en Corregimientos de diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, Identificados en la Población Objetivo

Valor del contrato: \$549.440.060 del 14 de junio de 2019

Fecha acta de inicio: Junio 21 de 2019

Otrosí N° 1 - Modificación de población objeto, quedando como producto: documentos PSMV ajustados para los corregimientos de Quebrada Seca y Zanjón Hondo en el municipio de Buga. – Fecha: 30 septiembre de 2019

Fecha de acta de terminación: Diciembre 20 de 2019

Fecha de acta de liquidación: Febrero 5 de 2020

En atención a trámites correspondientes a este componente, Vallecana de Aguas S.A. E.S.P como Gestor del PDA inicia actividades encaminadas a la consolidación de información necesaria para la contratación de una consultoría que permita ejecutar los recursos destinados para el componente ambiental durante la presente vigencia.

Así mismo se han realizado reuniones con personal de CVC solicitando conocer en qué términos puede apoyarse el ajuste de PSMV corregimentales solicitados por el municipio de Vijes, al encontrarse con Autos Sancionatorios en proceso de aplicación.

1.2 Sub Componente: Plan Ambiental Sectorial.

➤ Seguimiento y ajuste al Plan Ambiental Sectorial

Conforme como lo establece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre Vallecana de Aguas y CVC se firmó el Acta de Concertación del Plan Ambiental Sectorial 2016-2019, el cual fue aprobado por el Comité Directivo del PDA el 8 de mayo de 2018.

Siguiendo los lineamientos de Coordinación Institucional definidos en el Plan Ambiental, se ha venido coordinando y participando en reuniones con CVC, para identificar acciones en el cumplimiento de los requerimientos y permisos de CVC para los diseños y obras de Vallecana de Aguas S.A. E.S.P.

6. COMPONENTE IV: GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL.

6.1 Sub componente plan de gestión de riesgo sectorial.

- **Elaboración, aprobación y seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2020-2023.**

En el marco de este proyecto se realizaron las contrataciones de Consultorías necesarias para la elaboración del plan de Gestión del Riesgo Sectorial.

Se inició la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, de conformidad con el decreto 1425 de 6 de agosto de 2019 y los Lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2020-2023, publicados por la Dirección de Desarrollo Territorial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. En estos dos meses se inició la investigación y actualización de datos para acometer la parte diagnóstica del Plan.

6.2 Subcomponente: Implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial

- **Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y manejo de desastres.**

En Conocimiento del riesgo, se instalaron oficialmente, con participación del componente de gestión del riesgo, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y el Plan de Restauración de las cuencas Prioritarias

En Reducción del riesgo, se inició del análisis de los posibles proyectos por gestión de riesgo, a la luz del decreto 1425 de agosto de 2019. Mediante decreto 0129 de enero de 2020, *“se prohíbe el plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de contratación en la Gobernación del Valle del Cauca.”* El decreto se adoptó en Vallecaucana de Aguas.

En Manejo del desastre, el gobierno departamental dio término a la declaratoria de Calamidad Pública, y el retorno a la normalidad, firmado por la anterior administración en 2019.

7. COMPONENTE: RESIDUOS SÓLIDOS.

7.1 Sub componente aprovechamiento

Educación ambiental para fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos

“Implementar acciones prácticas de educación ambiental para fomentar la separación de residuos sólidos en la fuente, en instituciones educativas y comunidades de los Municipios de El Águila, Bolívar, La Victoria, Ginebra, Palmira, Argelia, Zarzal, Restrepo, Caicedonia, Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande, Sevilla y Alcalá”.

Contrato No.2000.13.02.275.2019

Valor del Contrato:\$599.879.000

Reinicio del contrato, estaba suspendido por que las actividades de talleres en instituciones educativas en el mes de diciembre no se podían realizar por las vacaciones en las instituciones educativas.

En el mes de febrero del 2020, entrega de puntos ecológicos realizadas en los municipios de: Palmira, Rozo y Bugalagrande. La entrega del punto ecológico se realiza con una actividad lúdica. En esta actividad participa toda la comunidad educativa

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	FECHA
PALMIRA	I.E Maria A. Penagos	3 de febrero 2020
ROZO	Rogelio Vásquez	5 de febrero 2020
BUGALAGRANDE	I.E Antonio Nariño	3 de febrero 2020
	I.E Diego Rengifo Salazar	3 de febrero 2020

Entrega de Punto Ecológico



Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos

Vallecaucana de Aguas está realizando diseños de mejoramiento para el área de compostaje de la PMIRS de El Dovio.

MOISES CEPEDA RESTREPO

Gerente Vallecaucana de AGUAS S.A. E.S.P.
Gestor PDA del valle del Cauca.

Proyectó: Diego Calderón - Profesional Universitario Área Técnica
Revisó y Aprobó: Miguel Edison Zuluaga M – Director Área Técnica
